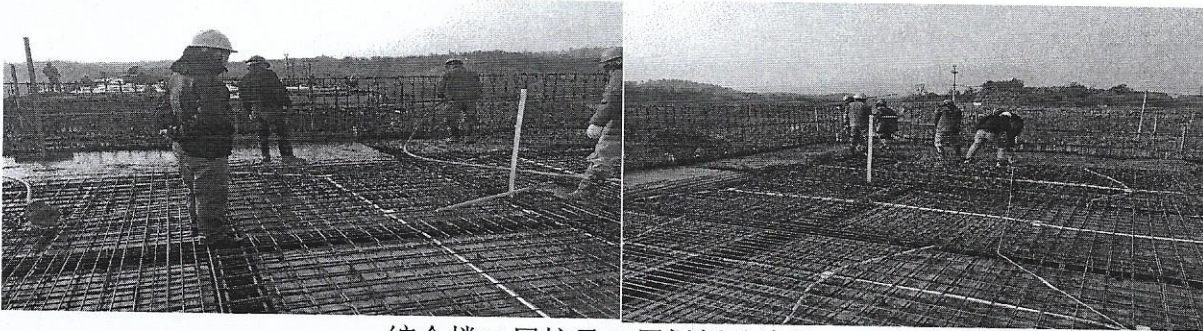



旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏生态公园

日期及气候: 2017年01月14日 晴	工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序: 综合楼二层柱及三层梁板砼浇筑	
旁站监理开始时间: 16:00	旁站监理结束时间: 19:30
施工情况: 施工人员按照图纸要求和规范, 进行钢筋绑扎验收合格后, 要求用水进行冲洗, 现场使用泵车输送(96m³)使用振捣器具两台, 采用商混标号C30混凝土浇筑独立基础及基础梁作业。  综合楼二层柱及三层梁板砼浇筑	
监理情况: 现场检查开盘鉴定, 现场检测塌落度140~160, 做砼养标养同养试块各一组, 现场跟踪浇筑过程。	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 德京集团股份有限公司 项目经理部:  质检员(签字):  2017 年 1 月 14 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员(签字):  2017 年 1 月 14 日
