

# 旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年04月03日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序：综合楼女儿墙砼浇筑旁站

旁站监理开始时间： 13:00

旁站监理结束时间： 14:30

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送（23m³）使用振捣器具两台，采用商混标号C30P6混凝土浇筑地梁、柱作业。

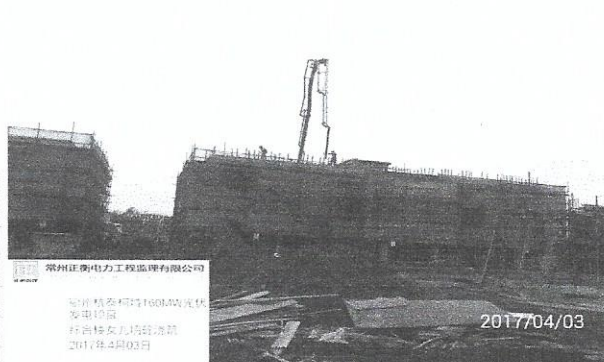

综合楼女儿墙砼浇筑旁站

监理情况：

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全
- 2、要求施工技术人员到场
- 3、检查开盘鉴定齐全
- 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程
- 5、全程跟踪浇筑过程。

发生情况：无

处理意见：无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

质检员（签字）：朱祥安  
2017年 4 月 3 日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：衢州杭泰柯城160MW光伏发电  
监理项目部

旁站监理人员（签字）：林强  
2017年 04 月 03 日
