

旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年03月02日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序：避雷针基础砼浇筑旁站

旁站监理开始时间： 15:30

旁站监理结束时间： 16:05

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，对现浇钢筋规格型号、模板间距及标高复检验收合格后，要求对现浇的底部标高进行控制放线，对主体钢筋底板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30，共计：18m³，现场施工人员10人，管理人员3人。

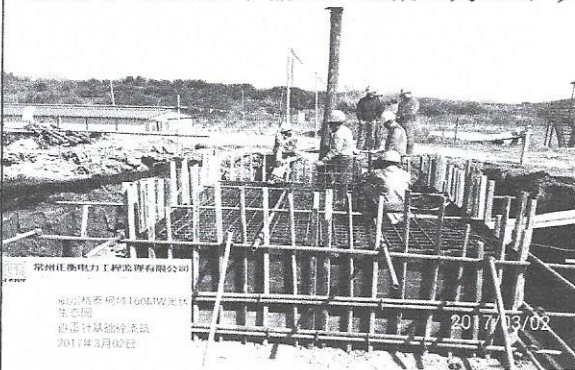

避雷针基础砼浇筑旁站

监理情况：

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全；
- 2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工；
- 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全；
- 4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；
- 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。

发生情况：现场检查发现避雷针基础未按要求进行模板加固处理。

处理意见：对现场避雷针基础模板进行加固处理防止胀模，满足施工要求。

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：叶宏斌

质检员（签字）：黄祥安

2017年03月02日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：张顶

2017年03月02日
