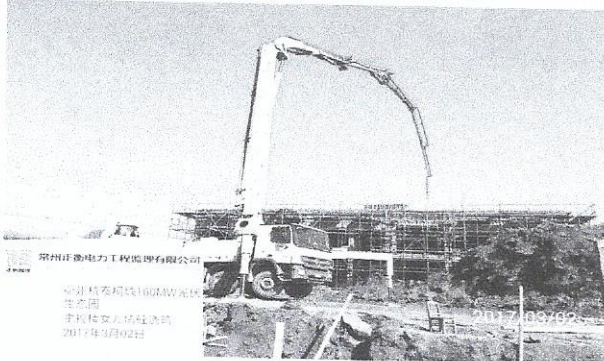
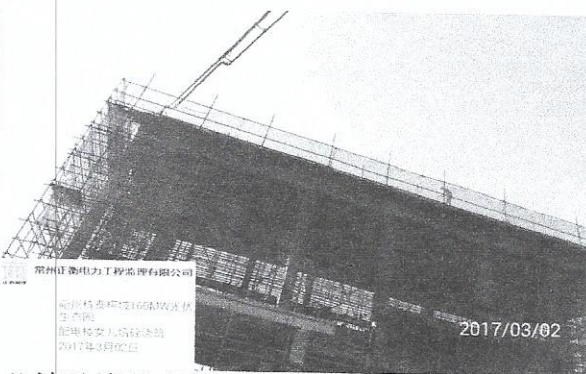





旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候: 2017年03月02日 晴	工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序: 配电楼、主控楼女儿墙砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 10:10	旁站监理结束时间: 14:20
<p>施工情况:</p> <p>施工人员按照图纸要求和规范,对现浇钢筋规格型号、模板间距及标高复检验收合格后,对主体钢筋底板进行冲洗,混凝土为商砼站提供,使用泵车输送,混凝土为C30,共计: 45m³,现场施工人员7人,管理人员3人。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">配电楼、主控楼女儿墙砼浇筑旁站</p>	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、浇筑前检查振捣器具齐全; 2、要求施工技术、安全管理人员到场,钢筋工、木工配合施工; 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全; 4、现场检测塌落度140mm~160mm,做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程; 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。 	
<p>发生情况:现场检查发现主控楼女儿墙模板有一处加固不到位导致胀模。</p>	
<p>处理意见:对现场主控楼女儿墙其他部位先浇筑,对胀模的模板重新加固处理,满足施工要求。</p>	
<p>施工企业: 德京集团股份有限公司</p> <p>项目经理部: </p> <p>质检员(签字):  2017年03月02日</p>	<p>监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部</p> <p>旁站监理人员(签字):  2017年03月02日</p>
