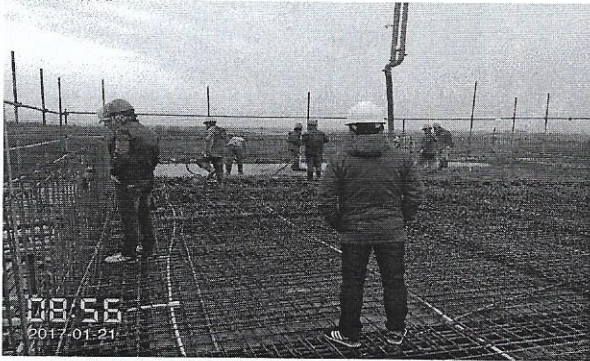


旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候: 2017年01月21日 晴		工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序: 配电楼二层柱子三层梁板			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 13:30	
施工情况: 施工人员按照图纸要求和规范, 进行钢筋绑扎验收合格后, 要求用水进行冲洗, 现场使用泵车输送(130m³)使用振捣器具两台, 采用商混标号C30混凝土浇筑基础框架梁, 柱作业。   配电楼二层柱子三层梁板			
监理情况: 现场检查开盘鉴定, 做砼养标养同养试块各一组, 现场检测塌落度140~160, 现场跟踪浇筑过程。			
发生情况: 无			
处理意见: 无			
施工企业: 德京集团股份有限公司 项目经理部: 叶宏斌 质检员(签字): 黄祥安 2017年 1 月 21 日		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员(签字): 张东 2017 年 01 月 21 日	
