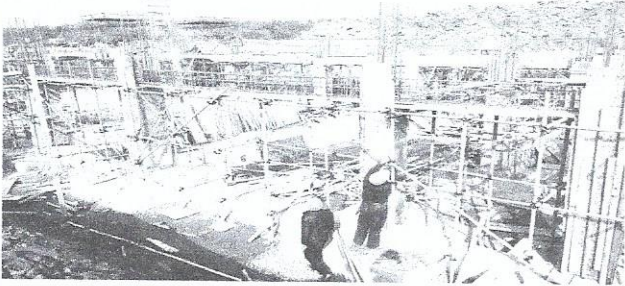



旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园

日期及气候: 2016年12月04日 晴	工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序: 配电装置楼基础独立柱承台及基础梁1~8/A~C轴	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 施工人员按照图纸要求和规范, 进行钢筋绑扎验收合格后, 要求用水进行冲洗, 现场使用泵车输送(80m³)使用振捣器具两台, 采用商混标号C30混凝土浇筑独立基础及基础梁作业。   配电装置楼基础框架梁浇筑	
监理情况: 现场检查开盘鉴定, 现场检测塌落度140~160, 做砼养标养同养试块各一组, 现场跟踪浇筑过程。	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 项目经理部: 叶宏斌 质检员(签字): 黄祥宇 2016年12月4日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员(签字): 祁颖 2016年12月04日
