

旁站监理记录表

工程名: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目园

日期及气候: 2017年03月17日小雨 | 工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序: 2#避雷针基础砼浇筑旁站

旁站监理开始时间: 9:20

旁站监理结束时间: 10:40

施工情况:

施工人员按照图纸要求和规范,对现浇钢筋规格型号、模板间距及标高复核验收合格后,要求对现浇的底部标高进行控制放线,对主体钢筋底板进行冲洗,混凝土为商砼站提供,使用泵车输送,混凝土为C30,共计: 18 m³,现场施工人员8人,管理人员3人。

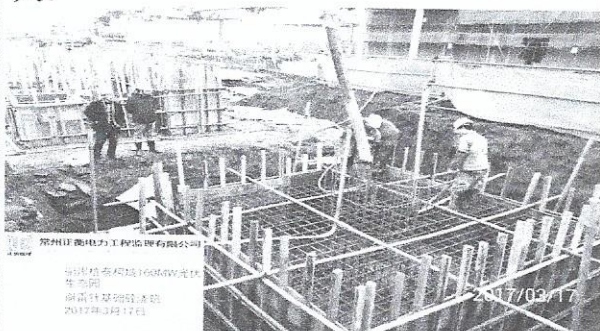

2#避雷针基础砼浇筑旁站

监理情况:

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全;
- 2、要求施工技术、安全管理人员到场,钢筋工、木工配合施工;
- 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全;
- 4、现场检测塌落度140mm~160mm,做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程;
- 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。

发生情况:现场检查发现避雷针基础未按要求进行模板加固处理。

处理意见:对现场避雷针基础模板进行加固处理防止胀模,满足施工要求。

施工企业: 德京集团股份有限公司

项目经理部: 叶家斌

质检员(签字): 黄祥安

2017年 3 月 17 日

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目监理项目部

旁站监理人员(签字):

2017年03月17日
