

旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年02月16日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村



旁站监理的部位及工序：SVG基础梁、柱砼浇筑

旁站监理开始时间： 13:00

旁站监理结束时间： 17:25

施工情况：

施工人员按照图纸设计和规范要求，进行钢筋模板验收合格后，用水进行冲洗灰尘，现场使用挖机输送和人工输送的方式（11m³）使用振捣器具一台，采用商混标号C30混凝土浇筑基础框架梁、柱作业。

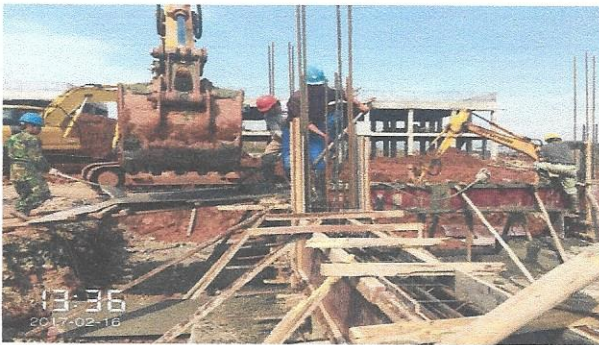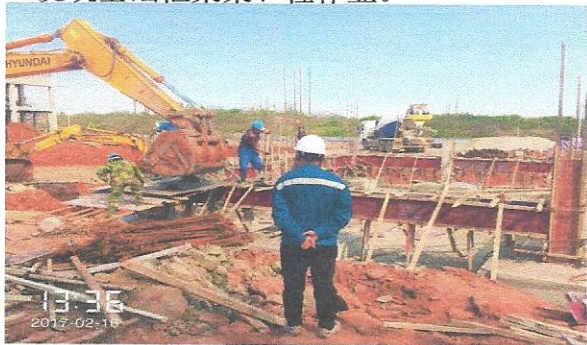

SVG基础梁、柱浇筑

监理情况：

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全
- 2、要求施工技术人员到场
- 3、检查开盘鉴定齐全
- 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程
- 5、全程跟踪浇筑过程。

发生情况：无

处理意见：无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

质检员（签字）：

黄祥安

2017年2月16日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：

张斌

2017年02月16日
