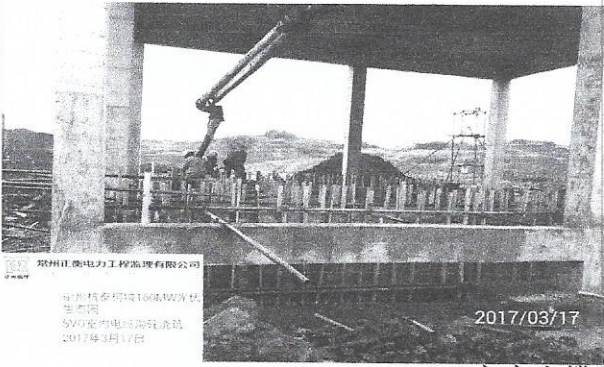


旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目园

日期及气候：2017年03月17日 晴		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：SVG室内电缆沟砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间： 16 :00		旁站监理结束时间： 17:00	
施工情况： 施工人员按照图纸要求和规范，对现浇钢筋规格型号、间距及标高复检验收合格后，要求对现浇的底部标高进行控制放线，对主体钢筋底板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30，共计：27m³，现场施工人员9人，管理人员3人。   SVG室内电缆沟砼浇筑旁站			
监理情况： 1、浇筑前检查振捣器具齐全； 2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工； 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全； 4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程； 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。			
发生情况：现场检查发现配电楼电缆沟底部基础未按要求进行标高控制。			
处理意见：对现场配电楼电缆沟底部标高复测后做标高控制点加控制线处理，满足施工要求。			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部：叶宏斌 质检员（签字）：黄祥安 2017年3月17日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2017年03月17日	
