

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目


日期及气候：2017年4月24日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：SVG室地面浇筑

旁站监理开始时间：13:00

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：施工人员按照图纸设计和规范要求，进行钢筋模板验收合格后，用水进行冲洗灰尘，现场使用挖机输送和人工输送的方式（11m³）使用振捣器具一台，采用商混标号C30混凝土浇筑基础框架梁、柱作业。

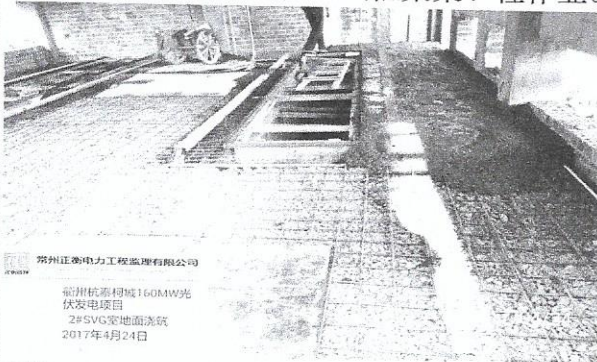

监理情况：

- 1、浇筑前检查钢筋的直径、绑扎间距质量；
- 2、要求施工技术负责人；
- 3、检查预埋槽钢的质量、尺寸为镀锌10cm；
- 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；
- 5、全程跟踪浇筑过程；
- 6、浇筑厚度符合设计要求。

发生情况：无

处理意见：无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

质检员（签字）：

黄锋富

2017年4月24日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员（签字）：

陈群生

2017年4月24日
