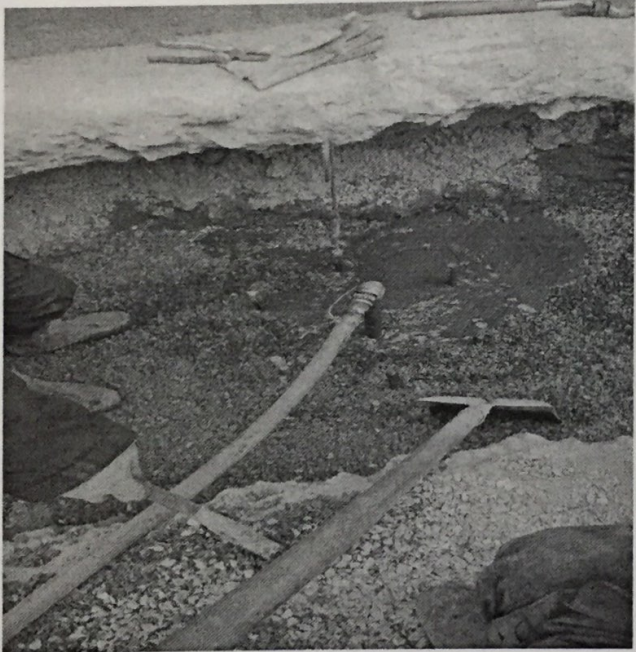


旁站监理记录表

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司

编号: CH-ZHJL-JL-20161224

3.2MW 分布式光伏发电项目

日期及天气: 2016/12/24	施工单位: 中设无锡机械设备工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 钻孔注浆	
旁站监理开始时间: 2016/12/24 7: 00	旁站监理结束时间: 13:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 注浆于早上 7 点开始, 注浆至上午 10 点左右发现周围回填土体漏浆, 后来现场采取有关措施后, 于 11 点半开始恢复注浆, 至下午 13 点完成注浆。  2/18-80	
发现的问题及处理情况: 发现地面以下 1M 左右的污水管接头处漏浆, 后采封堵措施后继续注浆。	
旁站监理人员 (签字): 张昌辉	2016 年 12 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

