

旁站监理记录表

工程名称：洛阳丰盈新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目

日期及气候：2017/1/9 0-6℃

工程地点：寺上村生活楼一层梁板柱砼浇筑


旁站监理的部位或工序：寺上

旁站监理开始时间：2017.1.9 13:00

旁站监理结束时间：2017.1.9 23:00

施工情况：

- 施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员、技术员就位。
- 材料供应：120 方商品砼准备充分。
- 现场布置：符合作业指导书规定要求。
- 混凝土搅拌、捣固、下料：采用 C30 商品砼，机械振捣。
- 安全文明措施：措施到位，在现场得到执行。

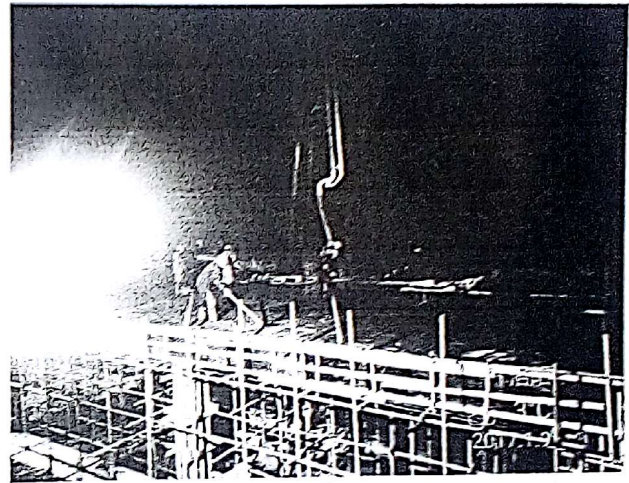

监理情况：

- 检查施工单位机械人员配置情况符合要求。
- 对进场商品混凝土厂家资质确定。
- 对进厂混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求。

发现问题及处理情况：

无

旁站监理人（签字）

唐生雷

2017年1月9日



由 扫描全能王 扫描创建
