

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-001

日期及天气：2017 年 1 月 14 日 晴 -2°~8°	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变—郑湾变 110kV 线路 G6#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 1 月 14 日 9:00	旁站监理结束时间：2017 年 1 月 14 日 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变—郑湾变 110kV 线路 G6#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 2 台振动棒，10 工人，方量 28.9M³，混凝土强度等级 C25，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程，现场实测坍落度 185mm，190 mm, 180 mm。	
发现的问题及处理情况： 现场个别工人未按要求正确佩戴个人防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
旁站监理人员（签字）：杨康 2017 年 1 月 14 日	



旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号:JZL6-002

日期及天气：2017 年 1 月 16 日 多云 -1°~7°	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变—郑湾变 110kV 线路 G18#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 1 月 16 日 13:00	旁站监理结束时间：2017 年 1 月 16 日 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变—郑湾变 110kV 线路 G18#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 2 台振动棒，10 工人，方量 16M³，混凝土强度等级 C25，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程，现场实测坍落度 180mm，185 mm, 195 mm。	
发现的问题及处理情况： 现场个别工人未按要求正确佩戴个人安全防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 1 月 16 日	

旁站监理记录表

工程名称:内乡县马山口镇50MW光伏电站项目

编号:JZL6-003

日期及天气: 2017年1月18日 多云 -2°~5°	施工单位: 裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏变一郑湾变110kV线路G17#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017年1月16日 13:00	旁站监理结束时间: 2017年1月16日 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 根据图纸对光伏变一郑湾变110kV线路G18#塔基混凝土浇筑进行旁站, 施工单位质检员到场, 特殊作业人员持证上岗, 安全、质量技术已进行交底, 钢筋、模板已通过监理验收, 混凝土资料齐全, 混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认, 混凝土施工按专项方案执行, 混凝土运输, 浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间, 混凝土振捣符合要求。 现场2台振动棒, 10工人, 方量9.5M³, 混凝土强度等级C25, 施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督, 临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块2组(其中同条件养护试块1组, 标准养护试块1组), 见证试块制作过程。 现场实测坍落度 180mm, 185 mm, 195 mm。	
发现的问题及处理情况: 现场个别工人未按要求正确佩戴个人防护用品, 已要求施工单位现场整改, 注意施工安全。	
旁站监理人员(签字):  2017年1月18日	

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-004

日期及天气：2017 年 2 月 23 日 多云 1°~12°	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变—郑湾变 110kV 线路 G10#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 2 月 23 日 10:00	旁站监理结束时间：2017 年 2 月 23 日 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变—郑湾变 110kV 线路 G10#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 2 台振动棒，10 工人，方量 17M³，混凝土强度等级 C25，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程，现场实测坍落度 160mm，155 mm, 165 mm。	
发现的问题及处理情况： 现场个别工人未按要求正确佩戴个人安全防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
	
旁站监理人员（签字）：杨康	2017 年 2 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-005

日期及天气：2017 年 2 月 24 日 晴 1°~16°	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变—郑湾变 110kV 线路 G8#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 2 月 24 日 7:00	旁站监理结束时间：2017 年 2 月 24 日 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变—郑湾变 110kV 线路 G8#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，8 工人，方量 9.8M³，混凝土强度等级 C25，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程，现场实测坍落度 150mm, 158mm, 162 mm。	
发现的问题及处理情况： 现场个别工人未按要求正确佩戴个人防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
旁站监理人员（签字）：  杨康 2017 年 2 月 24 日	

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-006

日期及天气：2017 年 3 月 1 号 天晴 4℃~16℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变一郑湾变 110kV 线路 G12#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 3 月 1 号 8:00	旁站监理结束时间：2017 年 3 月 1 号 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变一郑湾变 110kV 线路 G12#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 2 台振动棒，11 工人，方量 18M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程， 现场实测坍落度 140mm，155 mm,150 mm。	
发现的问题及处理情况： 发现，现场个别工人未按要求正确佩戴个人安全防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
	
旁站监理人员（签字）：杨康	2017 年 3 月 1 日

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

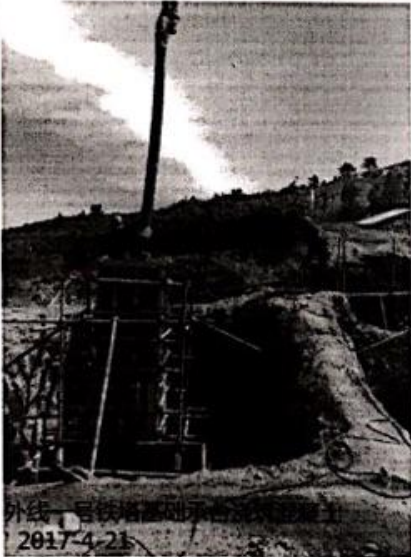
编号：JZL6-007

日期及天气：2017 年 3 月 4 号 天晴 2℃~14℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏变—郑湾变 110kV 线路 G11#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 3 月 4 号 10:00	旁站监理结束时间：2017 年 3 月 4 号 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对光伏变—郑湾变 110kV 线路 G11#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，10 工人，方量 12M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程， 现场实测坍落度 155mm，160mm,150 mm。	
发现的问题及处理情况： 发现，现场个别工人未按要求正确佩戴个人安全防护用品，未设安全旗绳。已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
旁站监理人员（签字） 	2017 年 3 月 4 日

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-009

日期及天气: 2017 年 4 月 21 号 晴 10℃~21℃	施工单位: 裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 线路 G1#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 根据图纸 对 110kV 线路 G1#塔基混凝土浇筑进行旁站, 施工单位质检员到场, 特殊 作业人员持证上岗, 安全、质量技术已进行交底, 钢筋、模板已通过监理验收, 混凝土资料齐全, 混凝土 浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认, 混凝土施工按专项方案执行, 混凝土运输, 浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间, 混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒, 8 工人, 方量 17M³, 混凝土强度等级 C20, 施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督, 临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组, 标准养护试块 1 组), 见证试块制作过程, 现场实测坍落度 150±20 mm  外线一号线塔基混凝土浇筑旁站 2017-4-21	
发现的问题及处理情况: 发现, 现场个别工人未按要求正确佩戴个人防护用品, 已要求施工单位现场整改, 注意施工安全。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 4 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-010

日期及天气：2017 年 4 月 28 号 晴 10℃~22℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 线路 G2#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：13:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 110kV 线路 G2#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，10 工人，方量 18M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程， 现场实测坍落度 150±20 mm  外线二号铁塔基础承台浇筑混凝土 2017-4-28	
发现的问题及处理情况： 整个浇筑过程正常。	
旁站监理人员（签字）：杨利康	2017 年 4 月 28 日

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-011

日期及天气：2017 年 5 月 6 号 晴 10℃~22℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 线路 G7#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：11:00	旁站监理结束时间：15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 110kV 线路 G7#AB 塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，10 工人，方量 14M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程。 现场实测坍落度 150±20 mm  对外线七号铁塔基础浇筑混凝土进行质量旁站 2017-5-6	
发现的问题及处理情况： 局部模板加固不牢有轻微炸模现象，要求重新加固模板	
旁站监理人员（签字）	2017 年 5 月 6 日



旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZ16-014

日期及天气：2017 年 5 月 26 号 晴 22℃~31℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 线路 G5#AB 塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 110kV 线路 G5#AB 塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，11 工人，方量 9M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程， 现场实测坍落度 150±20 mm  外线T5-AB基坑基础浇筑混凝土 2017-5-26	
发现的问题及处理情况： 个别工人未佩戴安全帽，要求其安全帽 	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 5 月 26 日	

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-013

日期及天气：2017 年 5 月 23 号 晴 22℃~33℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 线路 G3#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：11:30	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 110kV 线路 G3#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输、浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，8 工人，方量 14M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程。 现场实测坍落度 150±20 mm	
发现的问题及处理情况： 局部模板加固不牢有轻微炸模现象，要求重新加固模板后顺利完成浇筑	
	
旁站监理人员（签字）： 杨保 2017 年 5 月 23 日	

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

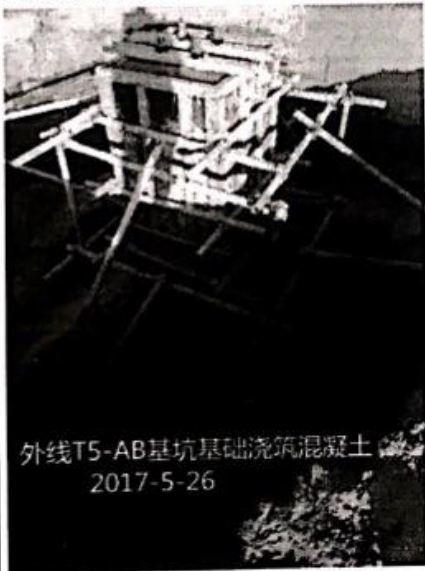
编号: JZL6-012

日期及天气: 2017 年 5 月 14 号 晴 14℃~31℃	施工单位: 裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 线路 G7#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 根据图纸对 110kV 线路 G7#CD 塔基混凝土浇筑进行旁站, 施工单位质检员到场, 特殊作业人员持证上岗, 安全、质量技术已进行交底, 钢筋、模板已通过监理验收, 混凝土资料齐全, 混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认, 混凝土施工按专项方案执行, 混凝土运输, 浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间, 混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒, 10 工人, 方量 15M³, 混凝土强度等级 C20, 施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督, 临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组, 标准养护试块 1 组), 见证试块制作过程。 现场实测坍落度 150±20 mm  七号铁塔C,D两基坑浇筑混凝土 2017-5-14	
发现的问题及处理情况: 局部模板加固不牢有轻微炸模现象, 要求重新加固模板	
旁站监理人员(签字):	2017 年 5 月 4 日

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-015

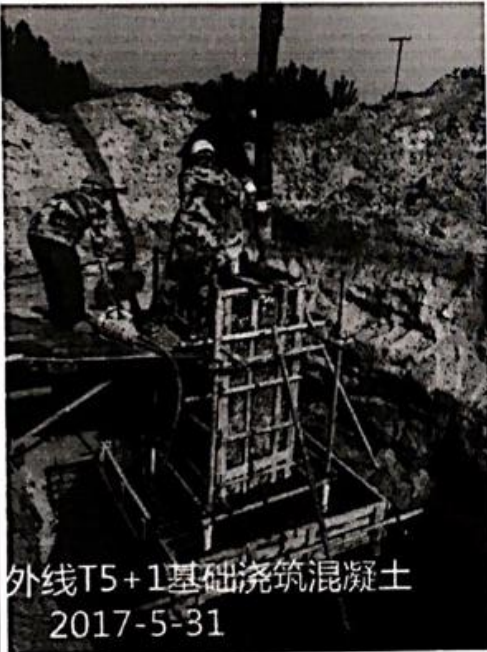
日期及天气: 2017 年 5 月 26 号 晴 22℃~31℃	施工单位: 裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 线路 G4#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 根据图纸对 110kV 线路 G4#塔基混凝土浇筑进行旁站, 施工单位质检员到场, 特殊作业人员持证上岗, 安全、质量技术已进行交底, 钢筋、模板已通过监理验收, 混凝土资料齐全, 混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认, 混凝土施工按专项方案执行, 混凝土运输, 浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间, 混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振捣棒, 11 工人, 方量 9M³, 混凝土强度等级 C20, 施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督, 临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组, 标准养护试块 1 组), 见证试块制作过程, 现场实测坍落度 150±20 mm 	
发现的问题及处理情况: 正常施工	
旁站监理人员(签字): 杨康	2017 年 5 月 26 日



旁站 监 理 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-016

日期及天气：2017 年 5 月 31 号 晴 25℃~35℃	施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 线路 G5+1#塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 110kV 线路 G5+1#塔基混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输、浇筑及间歇时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒，11 工人，方量 15M³，混凝土强度等级 C20，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组，标准养护试块 1 组)，见证试块制作过程， 现场实测坍落度 150±20 mm  外线T5+1基础浇筑混凝土 2017-5-31	
发现的问题及处理情况： 正常施工 	
旁站监理人员（签字）	2017 年 5 月 31 日

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-017

日期及天气: 2017 年 6 月 3 号 晴 20℃~30℃	施工单位: 裕实国际建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 线路 G5#CD 塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 根据图纸对 110kV 线路 G5#CD 塔基混凝土浇筑进行旁站, 施工单位质检员到场, 特殊作业人员持证上岗, 安全、质量技术已进行交底, 钢筋、模板已通过监理验收, 混凝土资料齐全, 混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认, 混凝土施工按专项方案执行, 混凝土运输, 浇筑及间隙时间未超过混凝土初凝时间, 混凝土振捣符合要求。 现场 1 台振动棒, 8 工人, 方量 8M³, 混凝土强度等级 C20, 施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督, 临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 2 组(其中同条件养护试块 1 组, 标准养护试块 1 组), 见证试块制作过程。 现场实测坍落度 160±20 mm  外线110kV线路G5#CD两基坑浇筑混凝土 2017-6-3	
发现的问题及处理情况: 局部模板有轻微炸模现象, 要求其重新加固。正常施工	
旁站监理人员(签字):	2017 年 6 月 3 日

