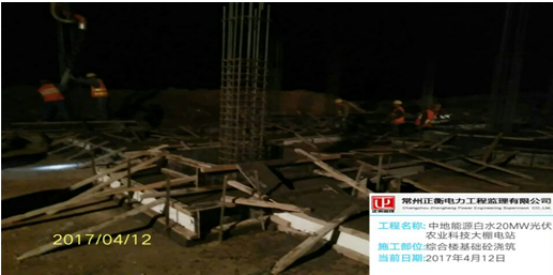


表 B.5 旁站监理记录表

编号 CZZHJL-020

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候：2017 年 4 月 12 日 多云 6-19℃	施工地点：综合楼
旁站监理的部位和工序：框柱基础、素砼基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：19:00	旁站监理结束时间：22:30
施工情况： • 施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为商品混凝土，汽车泵送，框柱基础、素砼基础砼，等级为 C30，共计 60 方。  	
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程及预埋件过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题 • 个别框柱钢筋不垂直。 • 素砼基础砼面覆膜养护不及时。	
处理意见： 1、安排钢筋工对框柱钢筋不垂直进行整改。 2、安排人对素砼基础砼面及时覆膜养护。	
备注（包括处理结果）： 施工单位即整改完成。	
承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司 质 检 员：余昊 日 期：2017 年 4 月 12 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2017 年 4 月 12 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存___1___份。
