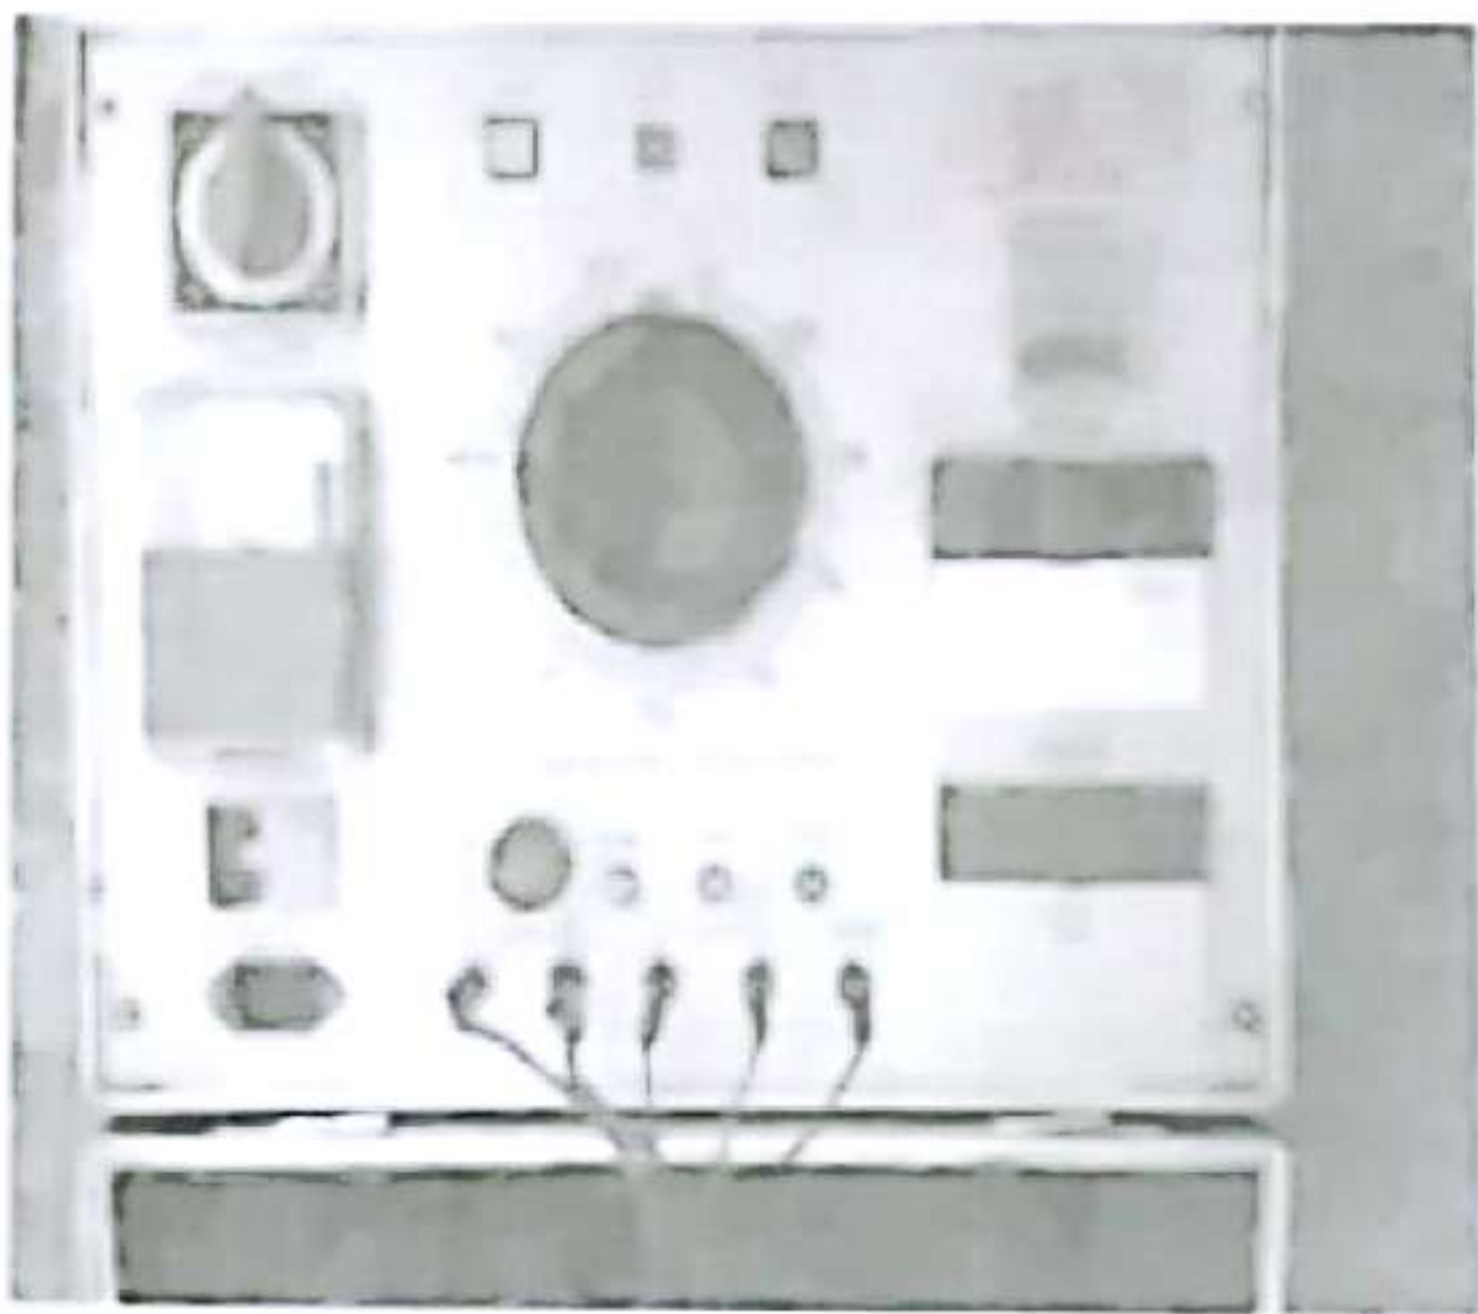
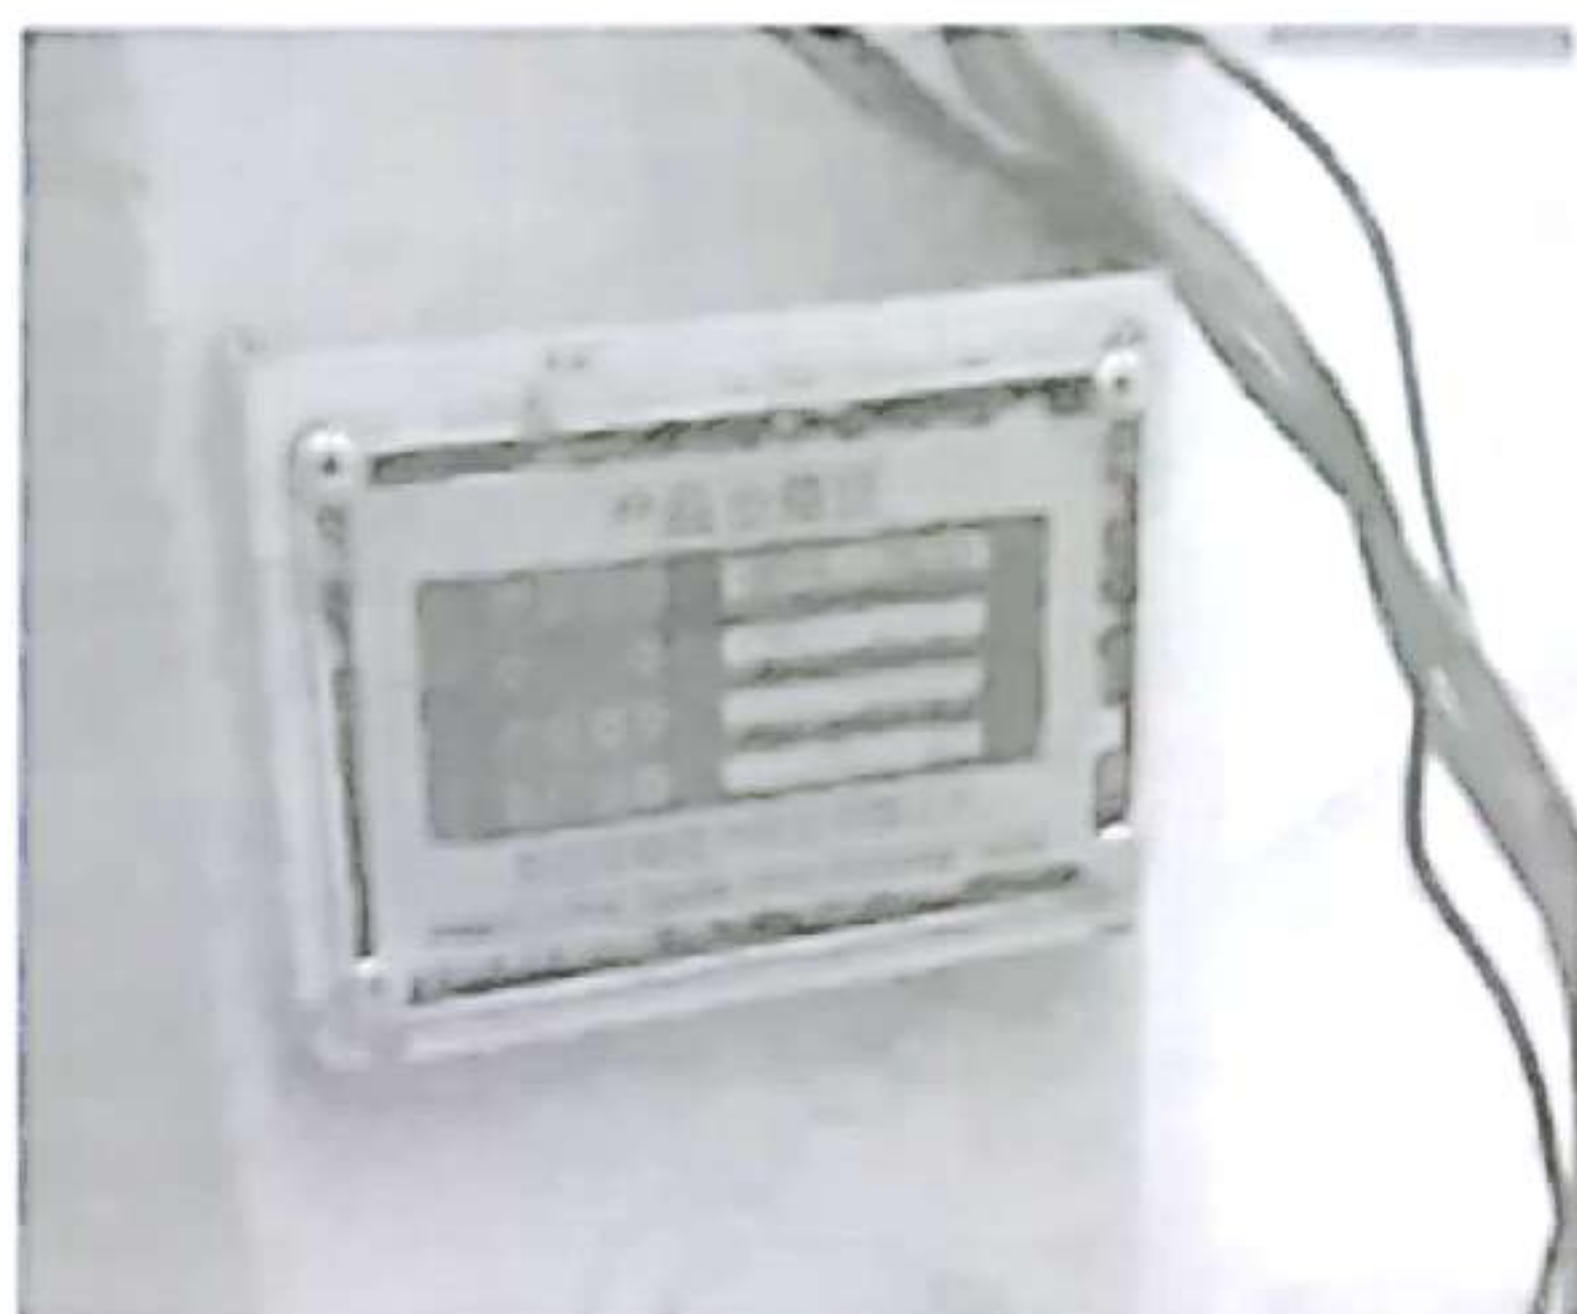


表 B.5 旁站监理记录表

编号 CZZHJL-02

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候：2017 年 6 月 8 日 多云 19-27℃	施工地点：光伏 11 区一体机房
旁站监理的部位和工序：一体机旁、耐压 80KV	
旁站监理开始时间：8:00 到 10:00	旁站监理结束时间：10:00
施工情况：试验单位对光伏区的一体机做耐压试验共计 15 台 • 试验人员 3 人，安全员 1 人、技术员 2 人。 • 操作设备如下图    • 陕西鼎成电力工程有限公司，试验人：杨长海、郭兴平 • 试验设备有 CMA 检测标志	
监理情况： • 监理检查试验人员资质，四周内环境安全。 • 检查三相对地耐压 80KV\1 分钟无击穿现象。 • 三只避雷器单独做过电压保护试验。 • 断电后已进行放电操作。	
发现问题 • 监理已提出的试验：要求试验单位认真负责，应该做的检测项不能漏做。	
处理意见：提供试验单位的资质和特殊人员的资质证书	
备注（包括处理结果）：	
试验单位：陕西鼎成电力工程有限公司 检测人员：杨长海 日期：2017 年 3 月 11 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日期：2017 年 6 月 8 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
