

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号 CZZHJL-022

日期及气候：2017 年 7 月 1 日晴 18-34℃

施工地点：消防水池、污水收容池


旁站监理的部位和工序：墙、顶板砼浇筑

旁站监理开始时间：7：30

旁站监理结束时间：12：00

施工情况：

- 施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为商品混凝土，人工装填，等级为 C30P6，共计 85 方。

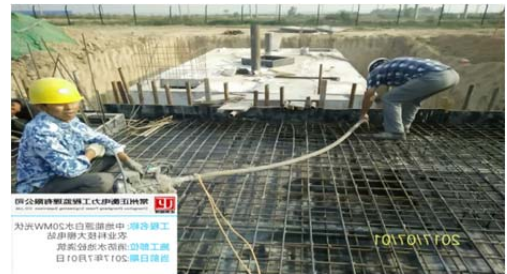

监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题

- 1、消防水池、污水收容池顶板钢筋垫块和马凳不足。
- 2、上人孔模板安装不方正。

处理意见：

- 1、安排工人对消防水池、污水收容池顶板钢筋增加垫块和马凳。
- 2、安排人重新安装上人孔模板。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司

质 检 员： 余昊

日 期：2017 年 7 月 1 日

项目监理机构： 正衡监理

旁站监理人员： 黎建光

日 期：2017 年 7 月 1 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
