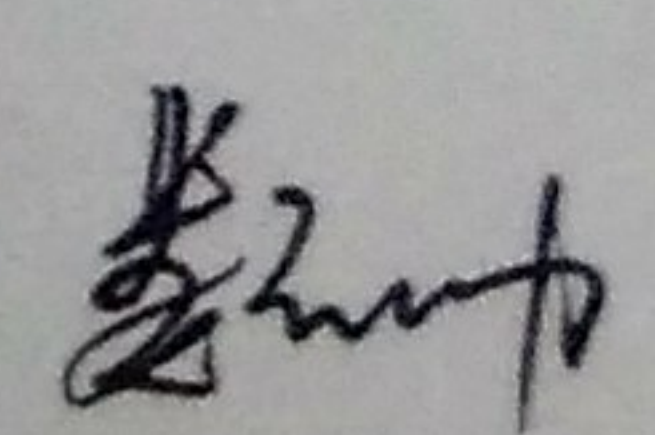


旁站监理记录表

工程名称：连云港板桥工业园一期 10MWp 光伏发电项目 编号： 006

日期及天气：2017.04.08 阴	施工单位：河南豫新太阳能科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：开关站设备基础	
旁站监理开始时间：12:25	旁站监理结束时间：14:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次施工位置有 站用变基础筏板、配电室基础墙身、消弧线圈基础墙身、运维楼基础地圈梁 1. 现场技术员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人。 2. 泵车 1 辆、振捣器 2 台。 3. 浇筑所用混凝土为 C35 P6 混凝土。 4. 现场浇筑连续无间断，振捣充分。 监理工作：到达现场后复测标高，检查模板尺寸，检查钢筋型号数量、检查钢筋绑扎位置、要求控制好钢筋保护层厚度，确认无误后进行浇筑，要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2017 年 04 月 08 日	
