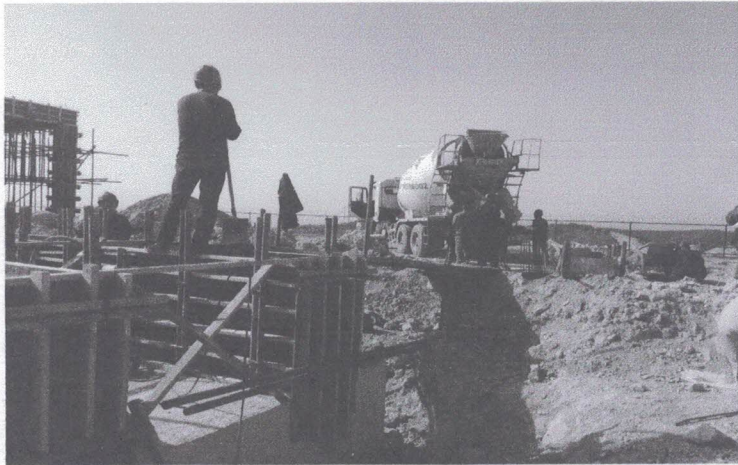


旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-011

日期及气候：2017年04月17日 晴		工程地点：晋城市泽州县南村镇环秀村	
旁站监理的部位及工序：主变基础浇筑		商砼—C30	
旁站监理开始时间：14: 00		旁站监理结束时间：17: 30	
施工情况：采用商混，强度C30，混凝土搅拌汽车运输1辆、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗，木工2人，抹灰工2人。 监理情况：1、检查模板的几何尺寸，均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输，资料齐全，符合要求，试块现场制作；塌落度检查，符合要求。3、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。4、模板支撑牢固，未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模，条件符合，可以开盘。			
			
发生情况：无			
处理意见：			
施工企业：山西晋通送变电有限公司 项目经理部：李少华 质检员（签字）：张保 2017年5月2日		监理企业：常州正衡工程监理有限公司 项目监理机构：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：刘圣奎 2017年4月17日	
