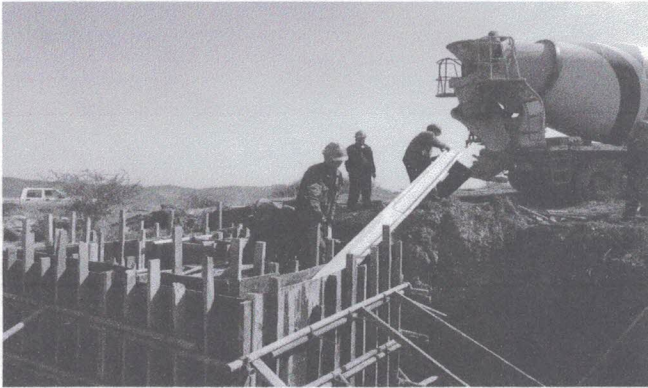


旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-019

日期及气候: 2017年04月23日 晴		工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村	
旁站监理的部位及工序: 5号箱变基础浇筑		商砼—C30	
旁站监理开始时间: 15: 00		旁站监理结束时间: 16: 40	
施工情况: 采用商混, 强度C30, 混凝土搅拌汽车运输1辆、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工2人,, 抹灰工2人。			
监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输, 资料齐全, 符合要求, 试块现场制作; 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模, 条件符合, 可以开盘。			
			
发生情况: 无			
处理意见:			
施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部: 质检员 (签字): 陈超		项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目	
旁站监理人员 (签字): 徐明		旁站监理人员 (签字): 徐明	
2017 年 04 月 23 日		2017 年 04 月 23 日	
