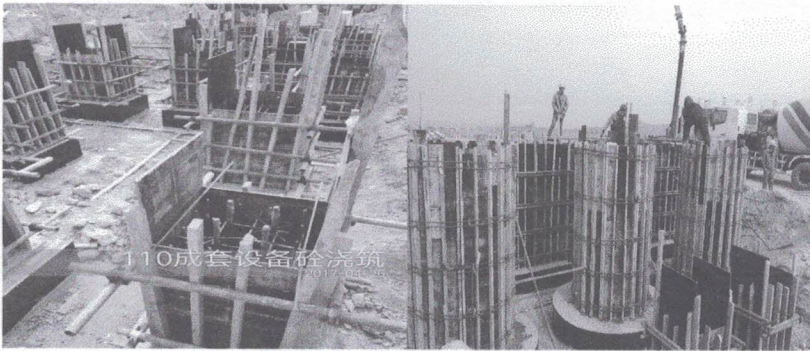


旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-024

日期及气候: 2017年04月26日 晴	工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序: 110成套设备、SVG基础 浇筑 商砼—C30	
旁站监理开始时间: 16: 00	旁站监理结束时间: 21: 00
施工情况: 采用商混, 强度C30, 混凝土搅拌汽车运输6辆、混凝土泵车一台、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工6人,, 抹灰工6人。	
监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输, 资料齐全, 符合要求, 试块现场制作; 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模, 条件符合, 可以开盘。	
	
发生情况: 无	
处理意见:	
施工企业: 山西晋通送变电有限公司 项目经理部:  质检员 (签字):  日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员:  日
