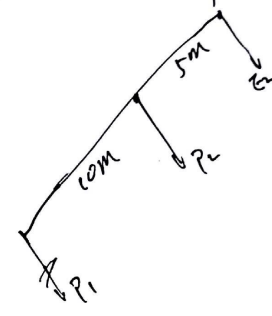


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2017. 6. 1 16-31℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工单位: 泰和新能源     |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区逆变器柜接地电阻测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 旁站监理开始时间: 8:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 旁站监理结束时间: 17:30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>逆变器柜测试4105A柜定检时加测。人员: 刘金 吴恩文、孙分升。<br/>         群助柜加测2只。红色测试线15m:<br/>         蓝色测试线10m; 绿色测试线5m。</p> <p>测试数据: 20# — 2.36Ω<br/>         21# — 0.51Ω; 22# — 0.75Ω<br/>         23# — 1.93Ω; 24# — 2.56Ω<br/>         25# — 2.29Ω; 26# — 2.1Ω<br/>         27# — 9.37Ω; 1# — 0.26Ω<br/>         2# — 0.19Ω; 3# — 0.33Ω<br/>         4# — 0.35Ω; 9# — 0.16Ω</p>  |                 |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>27#逆变器柜接地电阻过大, 不合格。<br/>         重新接线, 增加接地极, 并加大开挖深度, 立即进行处理。<br/>         整改后检测接地电阻为: 1.44Ω。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 旁站监理人员(签字): 孙分升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017年 6 月 1 日   |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
