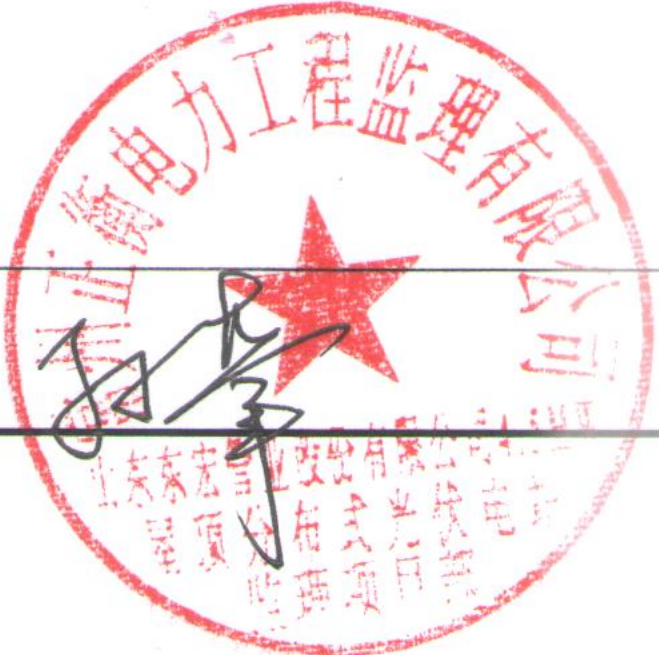


旁站监理记录表

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号： HBWX-XZY-PZ-008

日期：2017年5月13日 天气：晴	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础底板护墙混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017年5月13日9时0分	旁站结束时间：2017年5月13日12时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 c30 ，浇筑 58 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组是☒否☐符合要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 	
2017年5月13日	
