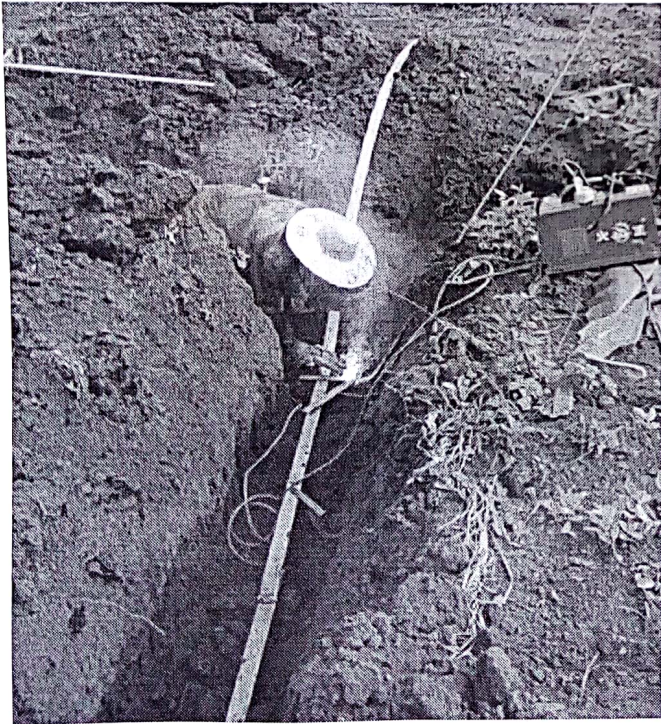
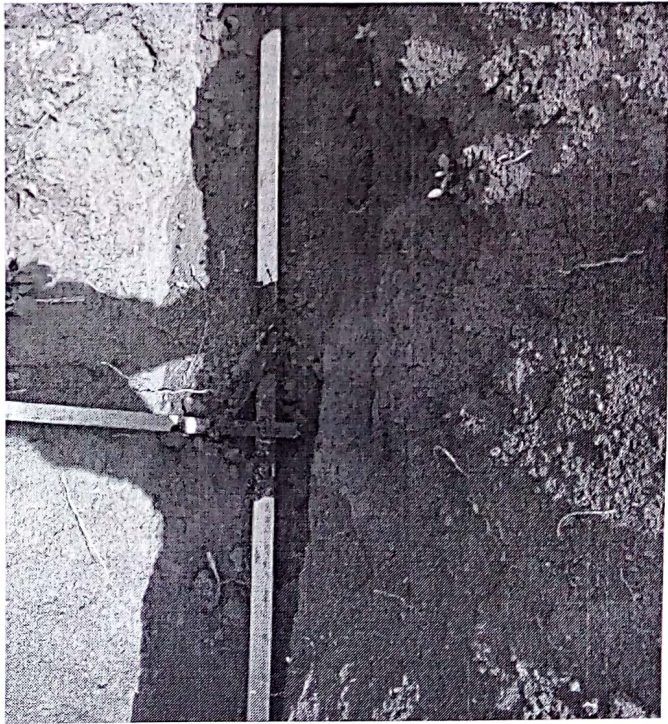



旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-015

日期及天气： 2017.8.19 晴 27~35℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：22#子系统接地焊接	
旁站监理开始时间：10 时 30 分	旁站监理结束时间：11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程水平接地体采用 50*5 镀锌扁钢，垂直接地体采用 50*50*2500 角钢，施工前发电机、电焊机、夹具等设备、工具、材料准备齐全，水平接地扁钢（6 米一根）沿沟底直线铺放，施工时，清理搭接部位表面卫生，搭接长度大于两倍扁钢宽度，使用夹具夹紧焊接区段，三棱边焊接牢固，最后刷防腐漆。水平、垂直接地体搭接焊接前，先将水平接地扁钢整形，确保与垂直接地体角边接触良好，保持两倍以上搭接长度，压坚焊牢，刷防腐油漆，水平接地体与支架端部分支接地体焊接时，为确保搭接面积，另增设一段跨接扁钢。  	
发现的问题及处理情况： 局部区段沟底不平坦，水平接地本起伏较大，现场已督促整改、	
旁站监理人员（签字）：   2017年8月19日	
