

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZLG-016

日期及天气：2017.8.19 晴 26~35℃

施工单位：中国核工业二三建设有限公司


旁站监理的部位或工序：41#箱变二次侧 ZRC-3*70/1KV 交流电缆接线

旁站监理开始时间：16 时 00 分

旁站监理结束时间：17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程利用液压线钳对电缆线头安装标准接线鼻后，再使用液化气喷枪对分相绝缘热缩护套加热收缩的方法，对电缆三相芯线分别安装绝缘护套，最后将其牢固压接在箱变低压侧接线端子上。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，施工操作规范，电缆芯线相色分清，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

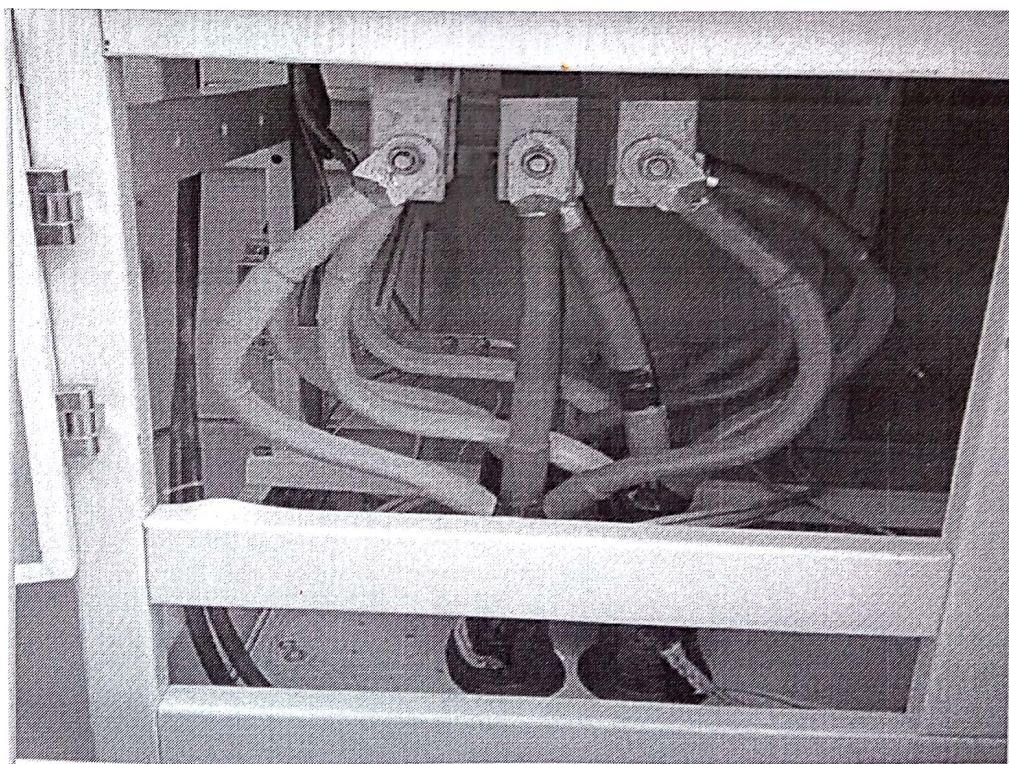

发现的问题及处理情况：

箱变至逆变间的电缆余线未完全放在桥架中，现场已整改。

旁站监理人员（签字）：

李云

