
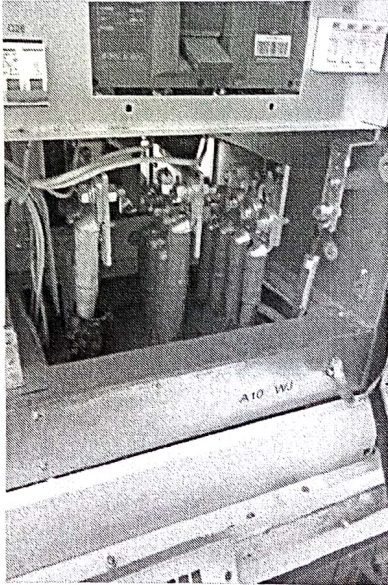


旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-023

日期及天气： 2017.9.25 晴 26~33℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：8#箱变、逆变间 ZRC-3*185/1KV 交流电缆接线	
旁站监理开始时间：9 时 30 分	旁站监理结束时间：11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程先利用液压线钳对电缆头安装标准接线鼻，再使用液化气喷枪加热方法，对电缆三相芯线分别安装绝缘热缩护套，并将三相芯线进行整形，摇测绝阻正常后。分别牢固压接在箱、逆变的接线端子上。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，施工操作规范，电缆芯线相色分清，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。   	
发现的问题及处理情况： 作业环境卫生较差，现场已整改。	
旁站监理人员（签字）：	2017 年 09 月 25 日

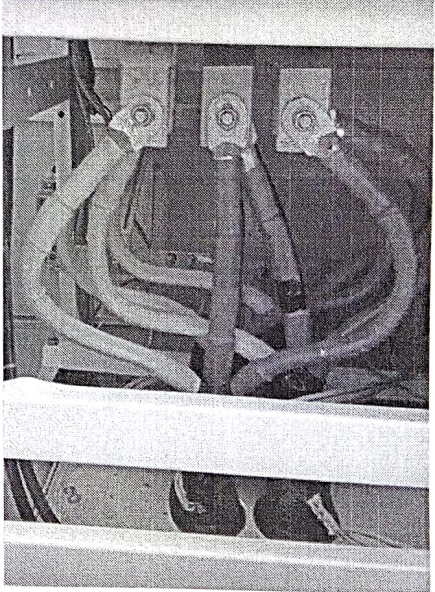
