

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-024

日期及天气：2017.9.26 晴 25~33℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
--------------------------	--------------------



旁站监理的部位或工序：14 区高压电缆、通讯电缆、光缆敷设

旁站监理开始时间：9 时 00 分

旁站监理结束时间：10 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用挖机挖好 800*1000 电缆沟，依次将高电缆、通讯电缆及光缆平铺于沟底，先在其上垫一层 10cm 厚软土，再盖一层保护砖块，最后再进行土方回填，电缆沟尺寸、电缆间距及施工流程符合规范要求。

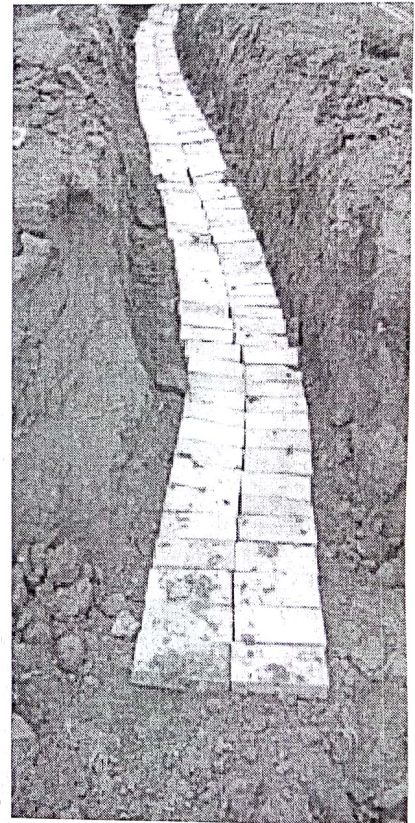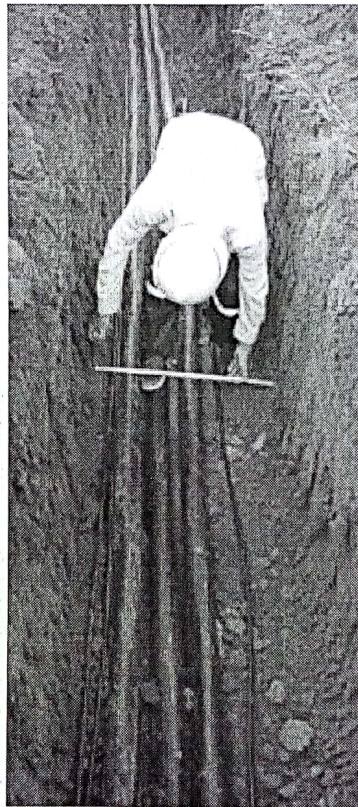

发现的问题及处理情况：

电缆表面软土覆盖厚度不够均匀，现场已整改。

旁站监理人员（签字）：



2017 年 09 月 26 日
