

## 旁站监理记录表


工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-004

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 日期及天气：2017、7、 29            | 晴 27~36℃ | 施工单位：广西兴能电力建设有限公司     |
| 旁站监理的部位或工序：主变 35KV 高压电缆耐压测试 |          |                       |
| 旁站监理开始时间：下午 15 点 50 分       |          | 旁站监理结束时间：下午 17 点 32 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、首先对检测单位的相关资质进行核查； 2、 对现场检测人员的相关资质进行核查 3、 对检测设备的使用鉴定证书进行核查； 4、 电缆耐压试验分别在每一相上进行，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地； 5； 交流耐压试验电压为出厂试验电压的 80%； 6、 检查现场布设安全警示带，满足实验安全要求。

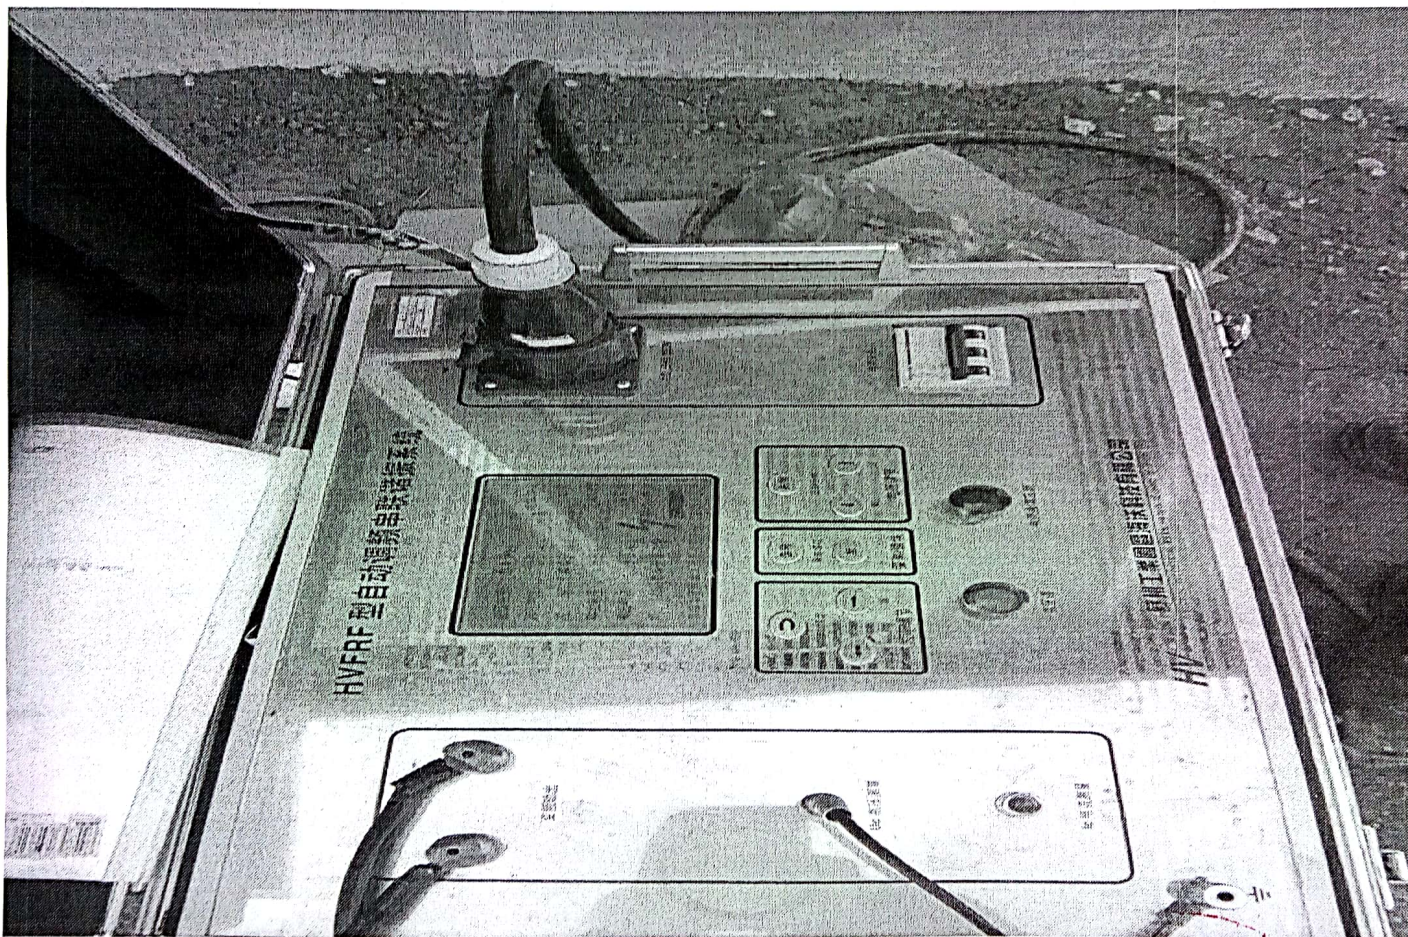

发现的问题及处理情况：

整个实验过程符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）：

李云

