

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-005

日期及天气：2017、8、8

晴 28~36℃

施工单位：中国核工业二三建设有限公司



旁站监理的部位或工序：11、12、14、16、18 号箱逆变基础承台浇筑

旁站监理开始时间：18 点 40 分

旁站监理结束时间：21 点 34 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用武鸣金华建材有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20 ；浇筑总计方量： $21m^3$ ；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。

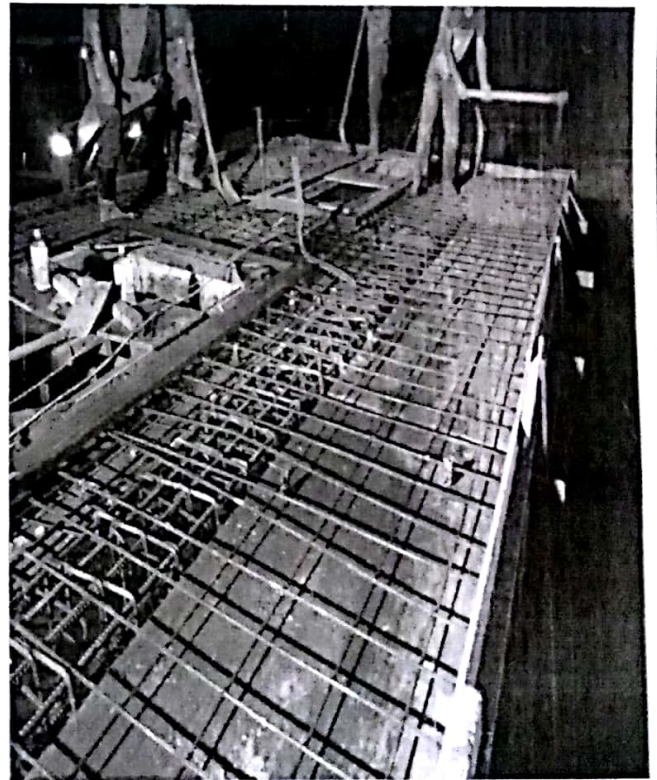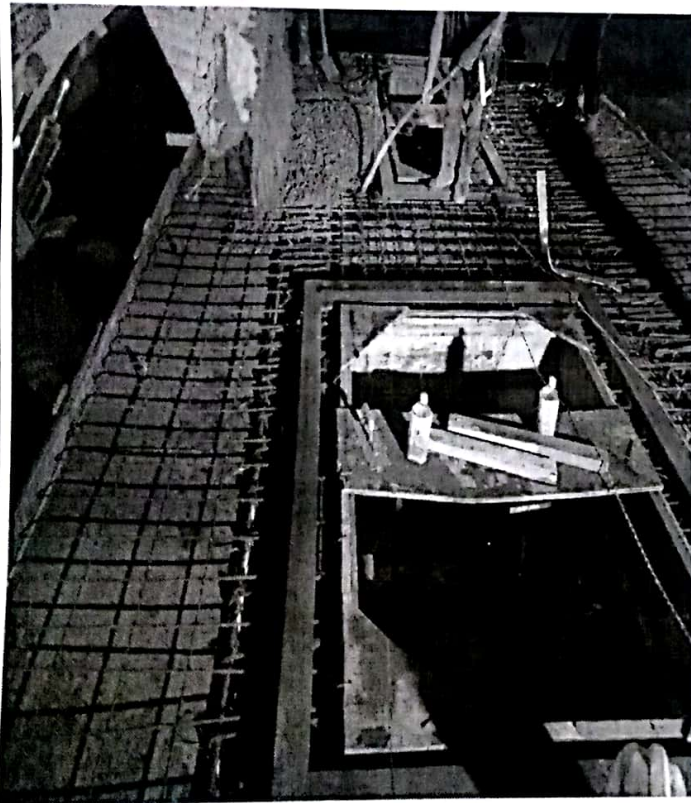

发现的问题及处理情况：

部分预埋件未做弯钩、预制桩内部钢筋漏放、垫块放置不规范；

经整改后，满足浇筑条件；

旁站监理人员（签字）：

孙富斌

