


旁站监理记录表

工程名称：南京夏普电子有限公司2.24MWp屋顶分布式光伏发电项目

编号项目：JL-PZ-001

日期及气候:	2017年08月10日 多云	工程地点:	南京夏普厂区2#箱变基础
旁站监理的部位及工序:			商砼--C15
旁站监理开始时间:	08:30	旁站监理结束时间:	13:30
施工情况: 浇筑砼前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。			

监理情况: 监理人员检查垫层、柱、钢筋绑扎的几何尺寸, 均符合要求。商品混凝土运到现场, 检查产品合格证及检验证明。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均。当混凝土分层浇筑时, 投料适中, 振捣上一层混凝土时, 土分层浇筑时, 投料适中, 振捣上一以消除两层之间的接缝, 振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间为30-50s, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜, 进行保湿养护。

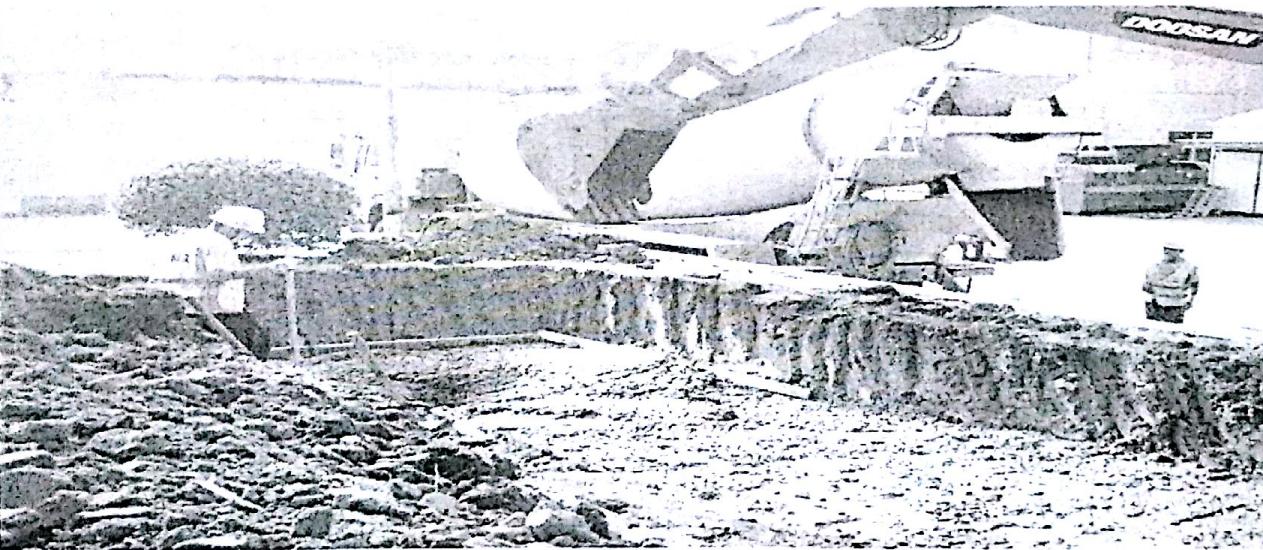

发生情况:

无

处理意见:

无

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字):

十一科技

刘彦光

2017年8月11日

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构:

旁站监理人员(签字):

