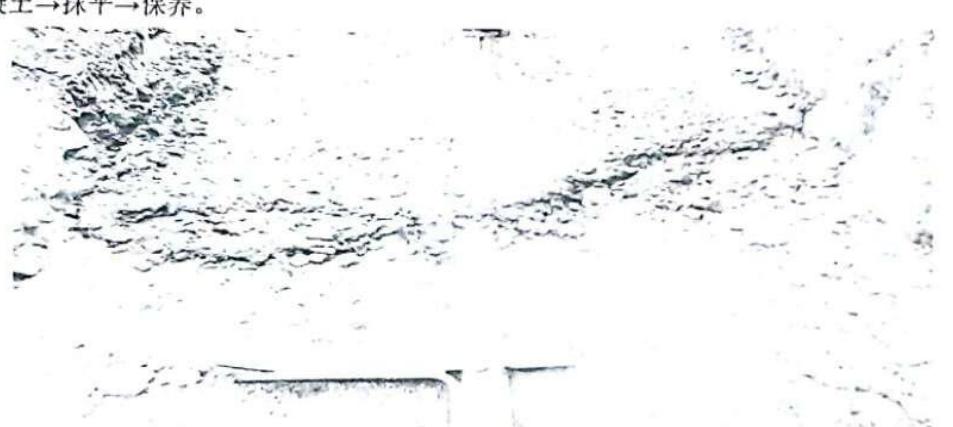


旁站监理记录表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZJL-008

日期及气候：2017 年 09 月 30 日	工程地点：山东省东营市广饶县大王镇山东华轮实业有限公司		
旁站监理的部位或工序：箱变基础垫层混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：2017.09.30 14:00	旁站监理结束时间：2017.09.30 16:30		
<p>施工情况：</p> <p>准备：1、信邦建设工程有限公司现场负责人张旭涛，施工人员 8 人。</p> <p>施工工艺：基底处理→操平标高→弹水平控制线→自拌混凝土→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。</p> 			
<p>监理情况：</p> <p>1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。</p>			
发现问题：垫层厚度未按照图纸要求施工			
处理意见：增加垫层厚度			
<p>备注：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工项目部：信邦建设工程有限公司 质 检 员：<u>张旭涛</u> 日 期：<u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日</td> <td style="width: 50%;">监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：<u>张旭涛</u> 日 期：<u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日</td> </tr> </table>		施工项目部：信邦建设工程有限公司 质 检 员： <u>张旭涛</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张旭涛</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日
施工项目部：信邦建设工程有限公司 质 检 员： <u>张旭涛</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张旭涛</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>09</u> 月 <u>30</u> 日		

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。
