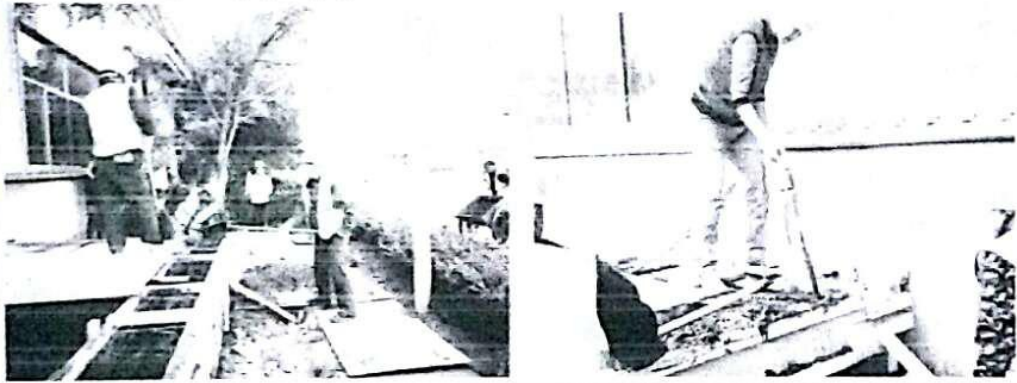


旁站监理记录表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-PZJL-011

日期及气候: 2017 年 10 月 06 日	工程地点: 山东省东营市广饶县大王镇山东华轮实业有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.10.11 15: 30 旁站监理结束时间: 2017.10.11 17: 30	
施工情况: 准备: 1、信邦建设工程有限公司施工负责人张旭涛, 施工人数 10 人。2、主要设备: 1 台震动棒、铁锹、铁抹子。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。	
	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 混凝土振捣不充分	
处理意见: 充分振动, 使表面产生浮浆为止	
备 注:	
施工项目部: 信邦建设工程有限公司 质 检 员: 徐伟 日 期: 2017 年 10 月 06 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张建忠 日 期: 2017 年 10 月 06 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。
