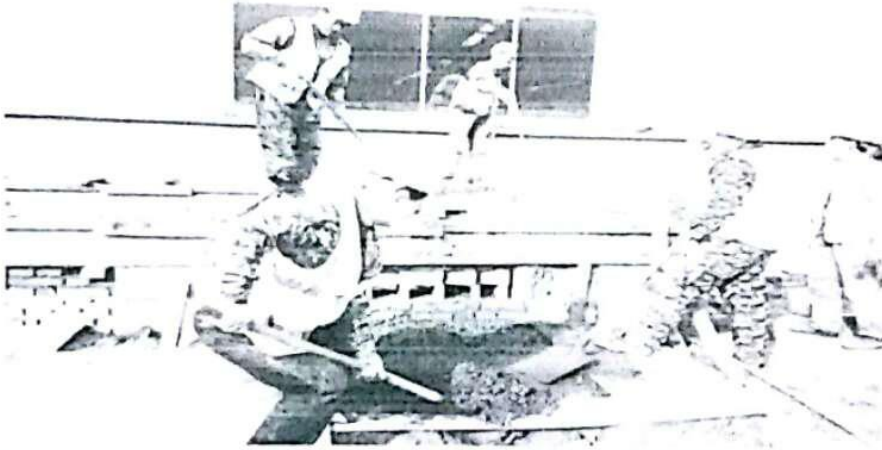


旁站监理记录表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JLPZ-014

日期及气候：2017 年 10 月 12 日	工程地点：山东省东营市广饶县大王镇山东华轮实业有限公司
旁站监理的部位或工序：2#箱变地圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017. 10. 12 8:00	旁站监理结束时间：2017. 10. 12 10: 30
施工情况： 准备：1、施工负责人信邦建设工程有限公司张旭涛，浇筑人员 6 人，看钢筋、模板 20 人。2、主要设备：插入式 1 台振动棒、木抹子、铁锹；3、砼强度等级 C25。 	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。6、坍落度测量为 160mm	
发现问题：部分振捣不到位。	
处理意见：充分振捣，直至表面产生浮浆为止。	
备 注：	
施工项目部：信邦建设工程有限公司 质 检 员：徐伟 日 期：2017 年 10 月 12 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张建伟 日 期：2017 年 10 月 12 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

监理项目部
