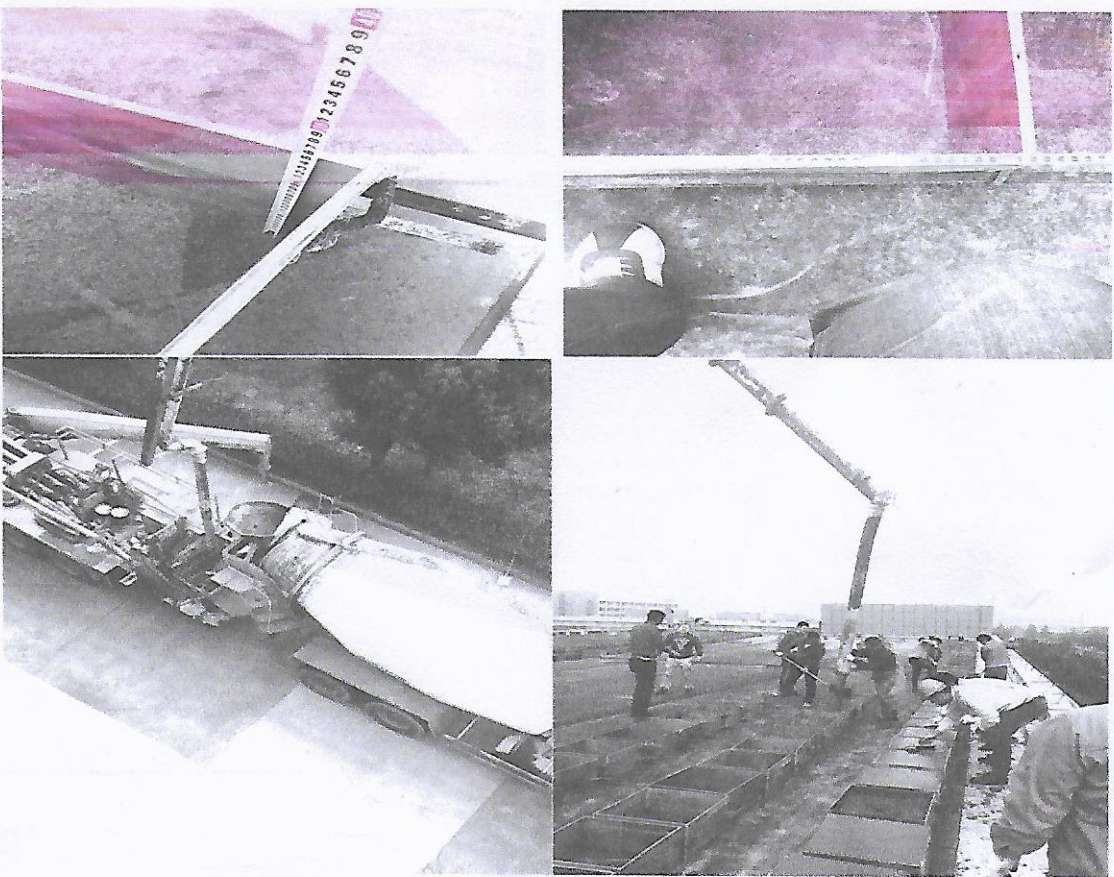


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-003

日期及天气: 2017 年 10 月 26 日 晴	施工单位: 嘉兴恒阳光伏有限公司
旁站监理的部位或工序: 继锋汽配混凝土配重块浇筑	
旁站监理开始时间: 15: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人员按照图纸要求和规范, 模板内壁进行涂油处理, 模具绑扎严实, 经测量模具规格为 50*50*25, 混凝土为商砼站提供, 使用泵车输送, 混凝土为 C25, 共计: 2 车, 现场施工人员 9 人, 管理人员 2 人。	
	
发现的问题及处理情况: 1、浇筑前检查振捣器具齐全; 2、要求施工技术、安全管理人员到场, 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全; 4、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。 5、施工现场均未佩戴安全防护用品, 已当场通知并要求立马佩戴安全帽等安全用品	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 10 月 26 日
