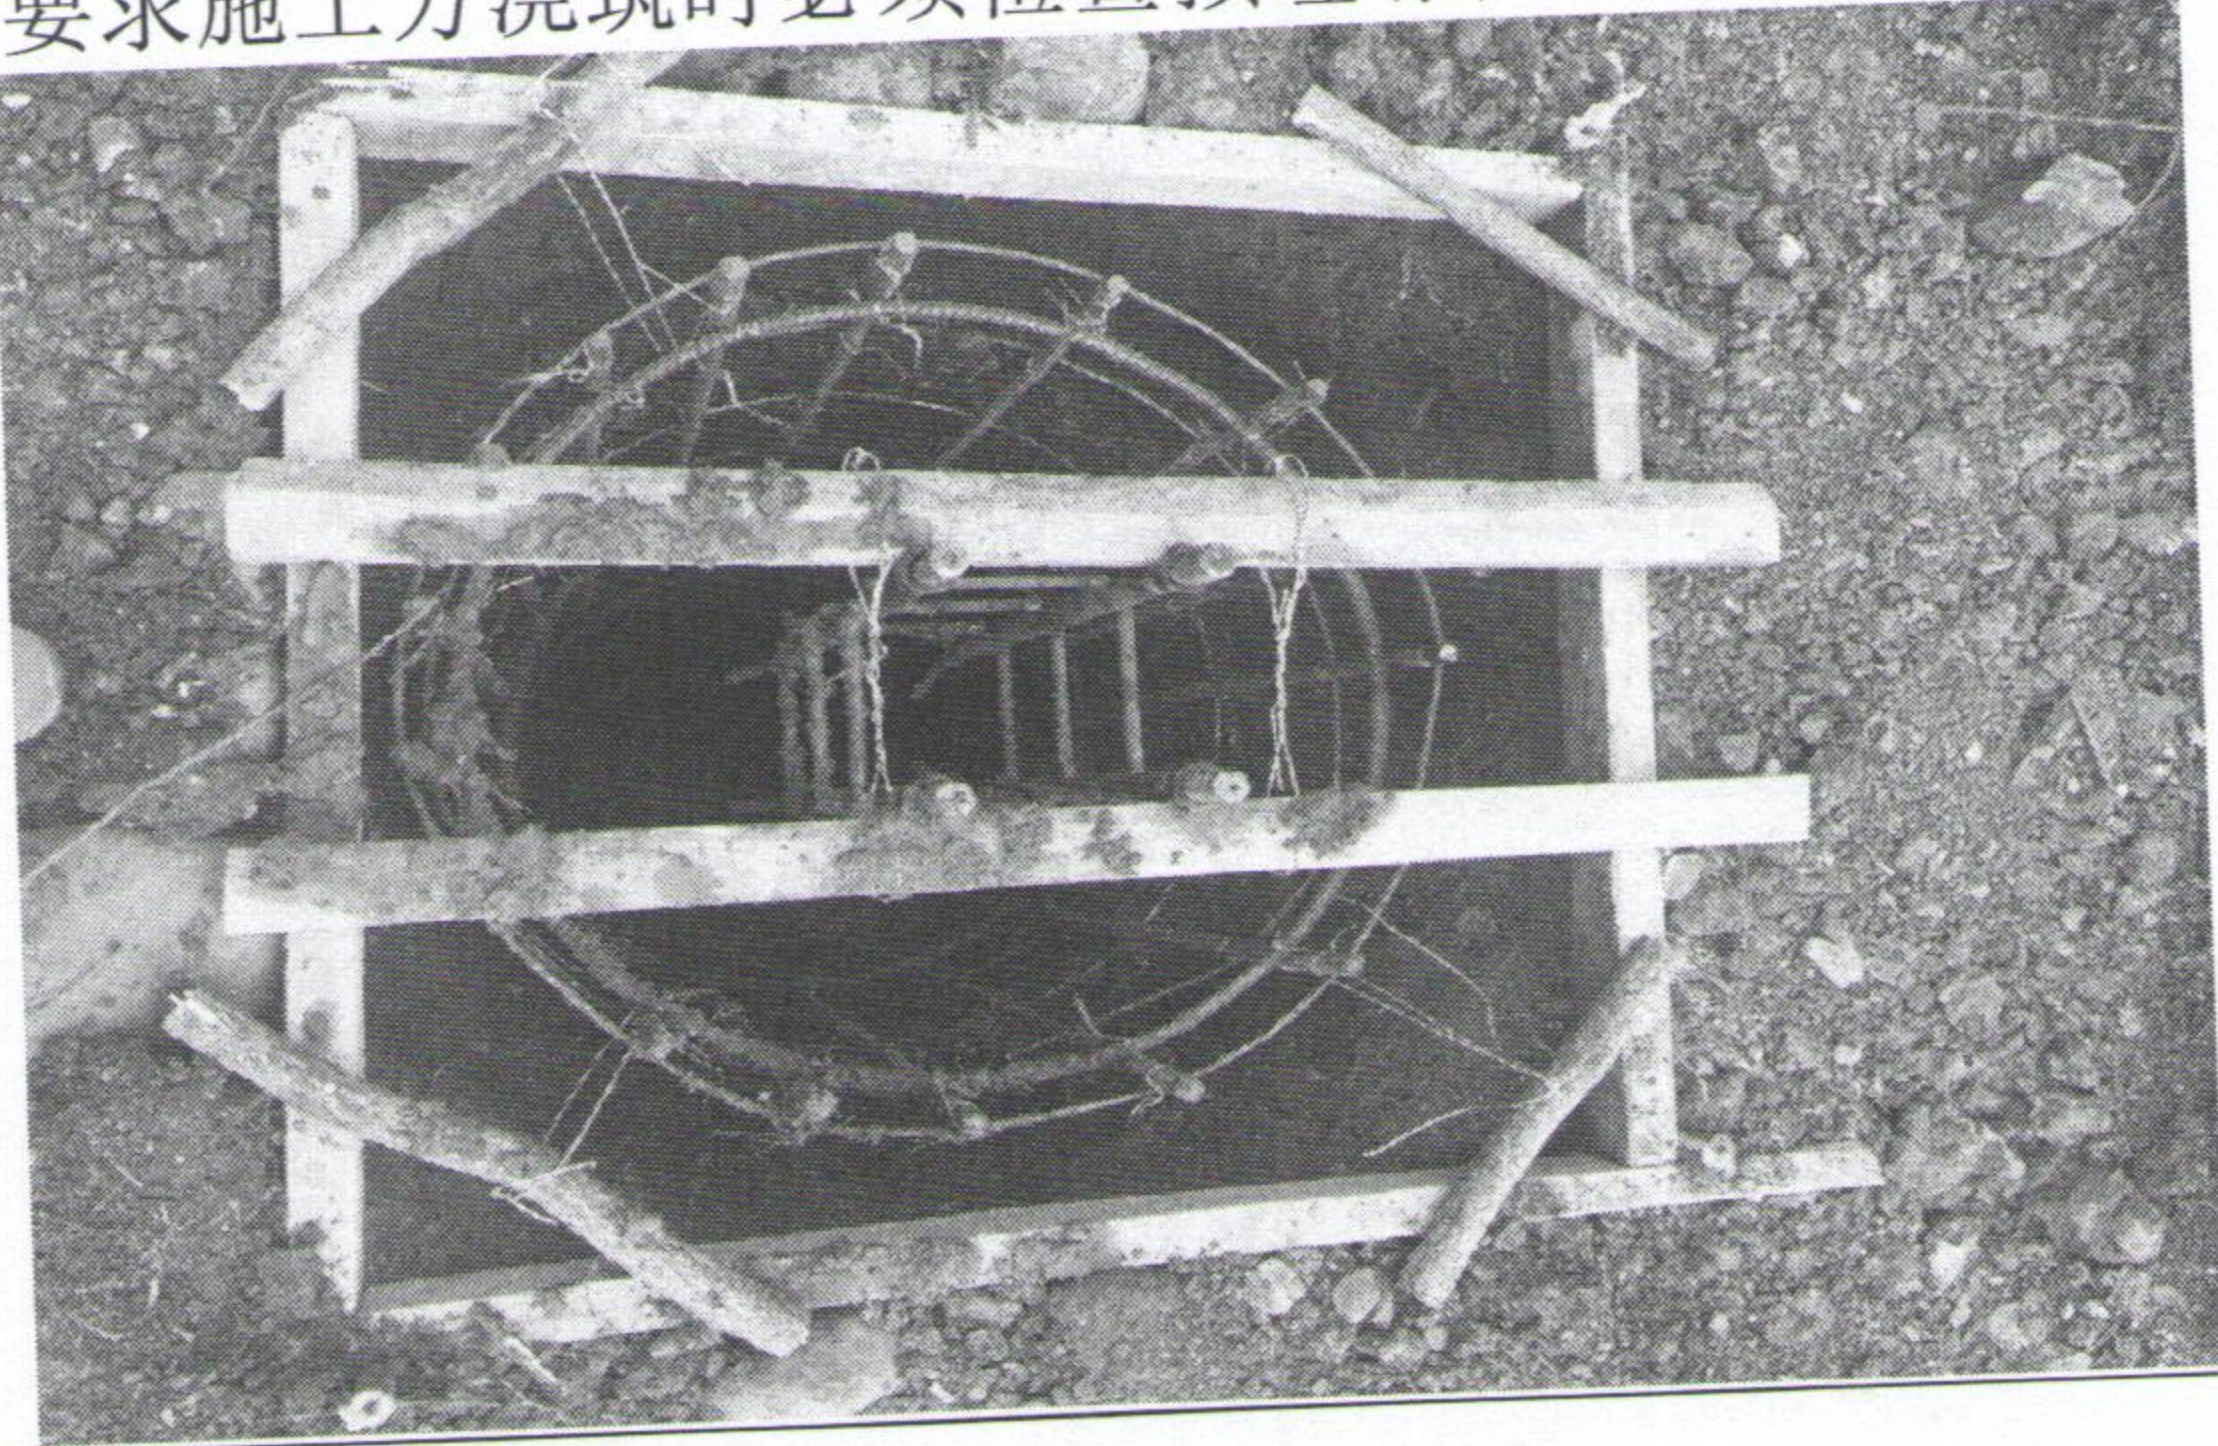


旁站监理记录表

工程名称： 华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目
编号:ZHJL-PZ-019

日期及气候:2017年11月24日 阴		工程地点: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目外线塔基	
旁站监理的部位及工序: G37+5塔基基础浇筑			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 10:00	
施工情况: 浇筑砼前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。			
监理情况: 砼浇筑前, 监理人员对基础钢筋绑扎及模板支护进行验收, 均符合设计要求。检查混凝土标号满足设计及规范要求, 现场制作标准养护试件试块, 作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 并插点均匀。混凝土投料适中, 振捣上一层混凝土时, 插入下一层中50mm左右, 以消除两层之间的接缝, 振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为25-40s, 以混凝土表面出现浮浆为止, 整个浇筑没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑时必须检查预埋螺栓中心点及标高。			
			
发生情况:		发现砼浇筑未按要求制作试块	
处理意见:		现场要求施工人员现场制作标准养护试件试块, 作为验证配合比依据。	
施工企业: 湖南卓越建设有限公司		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目		项目监理机构: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目	
质检员 (签字): 		旁站监理人员 (签字): 	
2017年 11 月 24 日		2017年 11 月 24 日	
