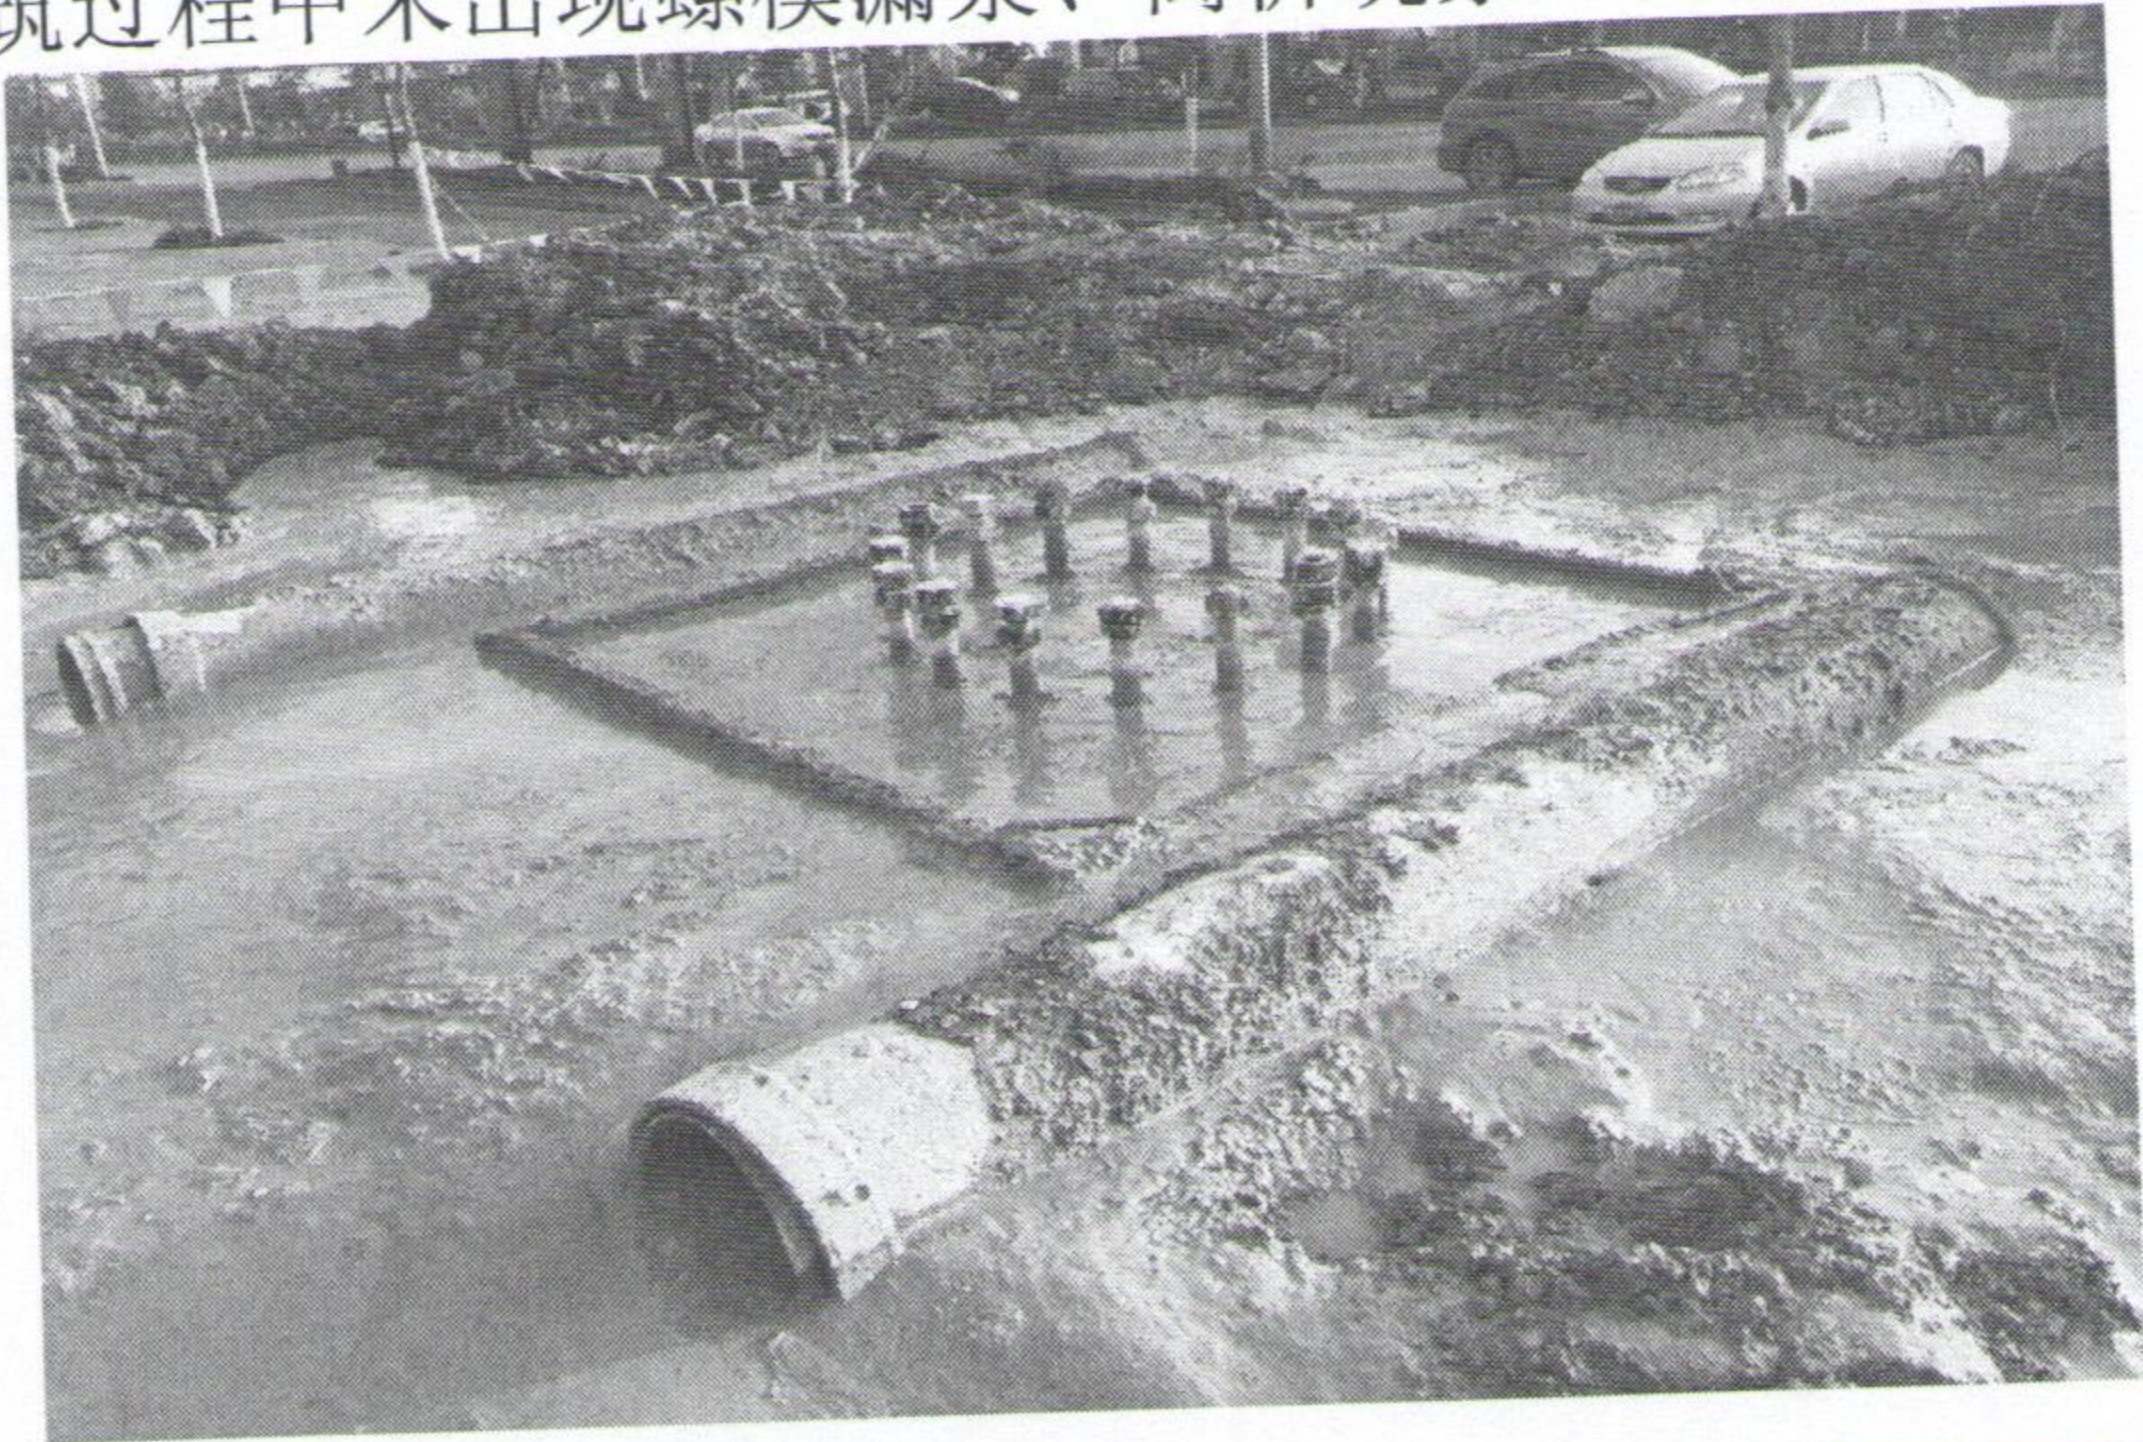


旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：ZHJL-PZ-020

日期及气候：2017年11月26日 晴		工程地点：庙前镇4*20MWp光伏发电项目外线塔基	
旁站监理的部位及工序：G41塔基基础浇筑			
旁站监理开始时间：10:00		旁站监理结束时间：11:40	
施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。			
监理情况：砼浇筑前，监理人员对基础钢筋绑扎及模板支护进行验收，均符合设计要求。检查混凝土标号满足设计及规范要求，现场制作标准养护试件试块，作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，并插点均匀。混凝土投料适中，振捣上一层混凝土时，插入下一层中50mm左右，以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。浇筑过程中未出现螺模漏浆、离析现象，浇筑过程符合规范要求； 			
发生情况：		浇筑现场有积水	
处理意见：		现场要求施工人员现场排水干净后再施工	
施工企业：湖南卓越建设有限公司		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部：庙前镇4*20MWp光伏发电项目		项目监理机构：庙前镇4*20MWp光伏发电项目	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2017年 11 月 26 日		2017年 11 月 26 日	
