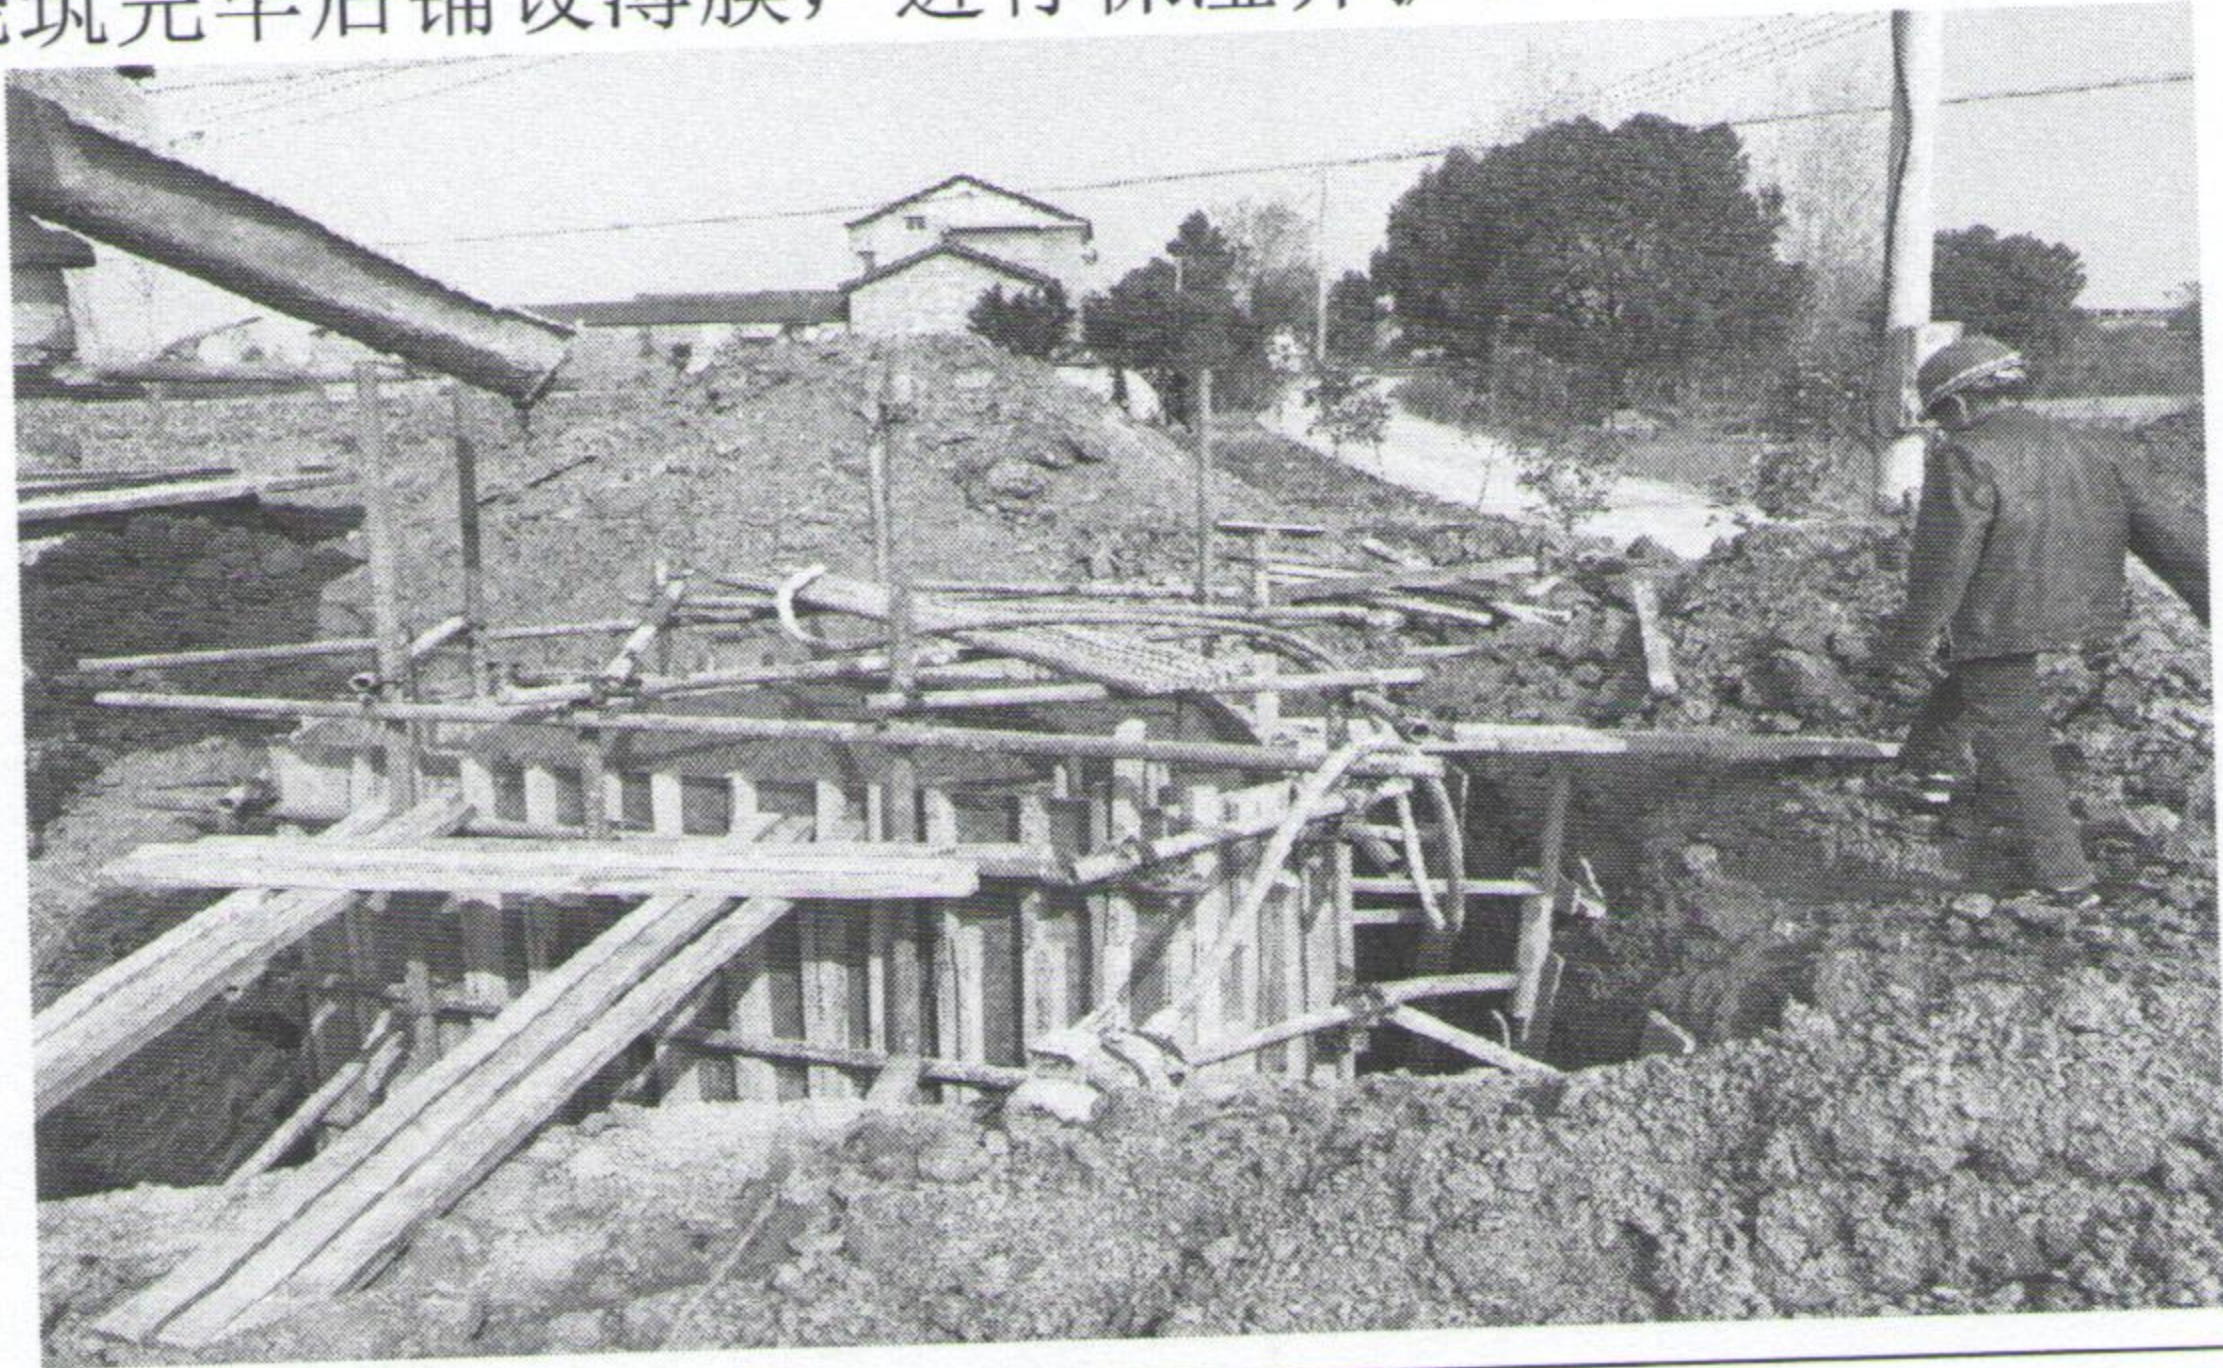


旁站监理记录表

工程名称： 华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目
编号:ZHJL-PZ-023

日期及气候:2017年12月01日 晴		工程地点: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目升压站	
旁站监理的部位及工序: 避雷针基础砼浇筑			
旁站监理开始时间: 10:10		旁站监理结束时间: 11:50	
施工情况: 浇筑砼前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。			
监理情况: 监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸, 均符合要求。检查产品合格证及检验证明, 现场制作标准养护试件试块, 作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。当混凝土分层浇筑时, 投料适中, 振捣上一层混凝土时, 插入下一层中50mm左右, 以消除两层之间的接缝, 振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为25-40s, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜, 进行保湿养护。 			
发生情况: 无			
处理意见: 无			
施工企业: 湖南卓越建设有限公司		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目		项目监理机构: 庙前镇4*20MWp光伏发电项目	
质检员 (签字): 		旁站监理人员 (签字): 	
2017年 12 月 01 日		2017年 12 月 01 日	
