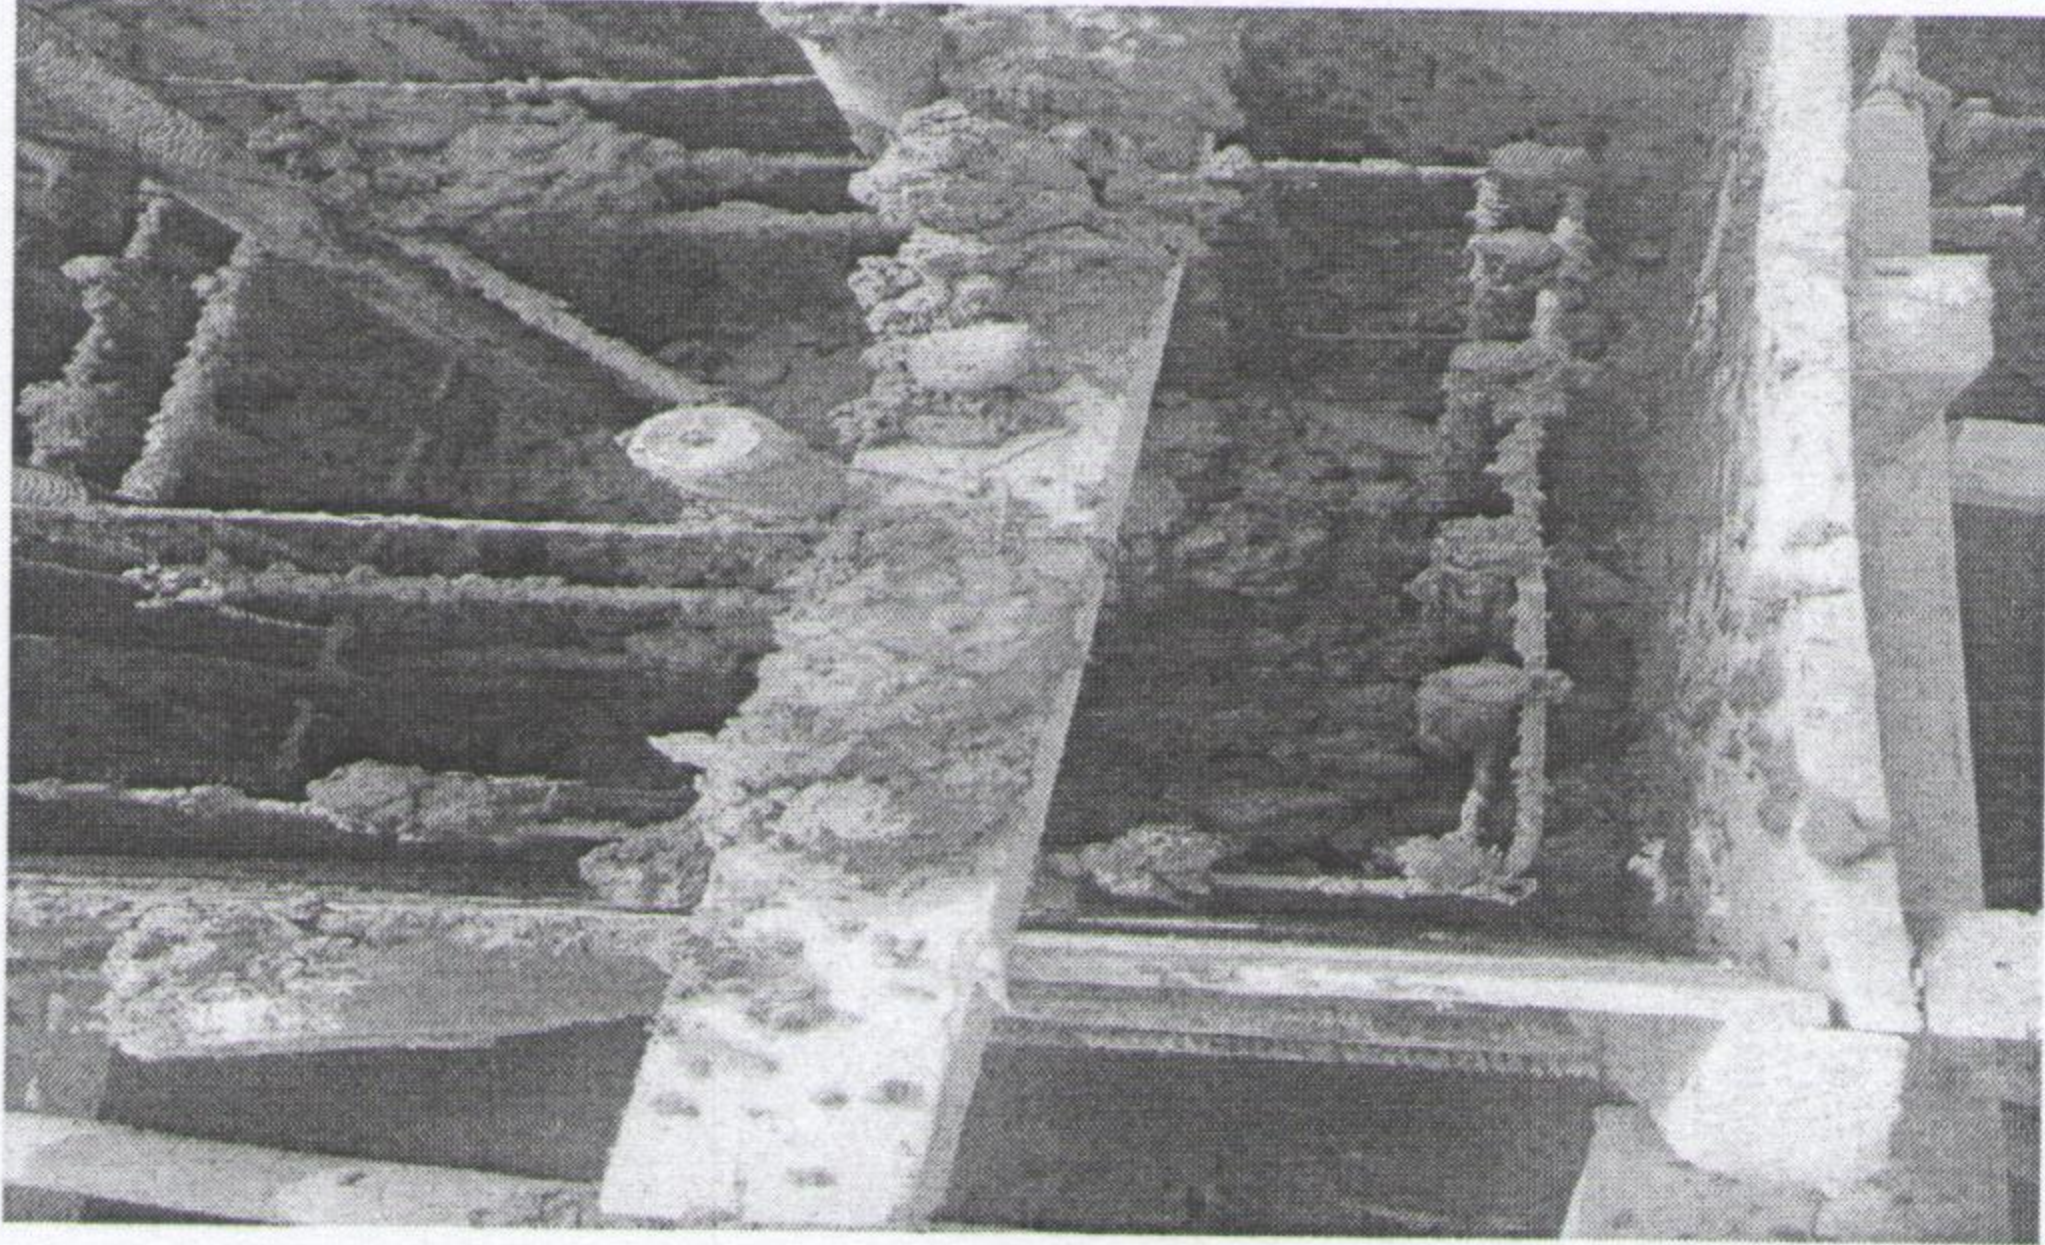


旁站监理记录表

工程名称： 华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目
编号:ZHJL-PZ-008

日期及气候：2017年11月6日 晴		工程地点： 庙前镇4*20MWp光伏发电项目外线塔基	
旁站监理的部位及工序： G3、G35塔基基础浇筑			
旁站监理开始时间： 8:30		旁站监理结束时间： 11:00	
施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。			
监理情况：砼浇筑前，监理人员对基础钢筋绑扎及模板支护进行验收，均符合设计要求。检查混凝土标号满足设计及规范要求，现场制作标准养护试件试块，作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，并插点均匀。混凝土投料适中，振捣上一层混凝土时，插入下一层中50mm左右，以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为25-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，整个浇筑没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑时必须检查预埋螺栓中心点及标高。 			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业： 湖南卓越建设有限公司		监理企业： 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部：庙前镇4*20MWp光伏发电项目		项目监理机构：庙前镇4*20MWp光伏发电项目	
质检员（签字）：  2017年 11 月 06 日		旁站监理人员（签字）：  2017年 11 月 06 日	
