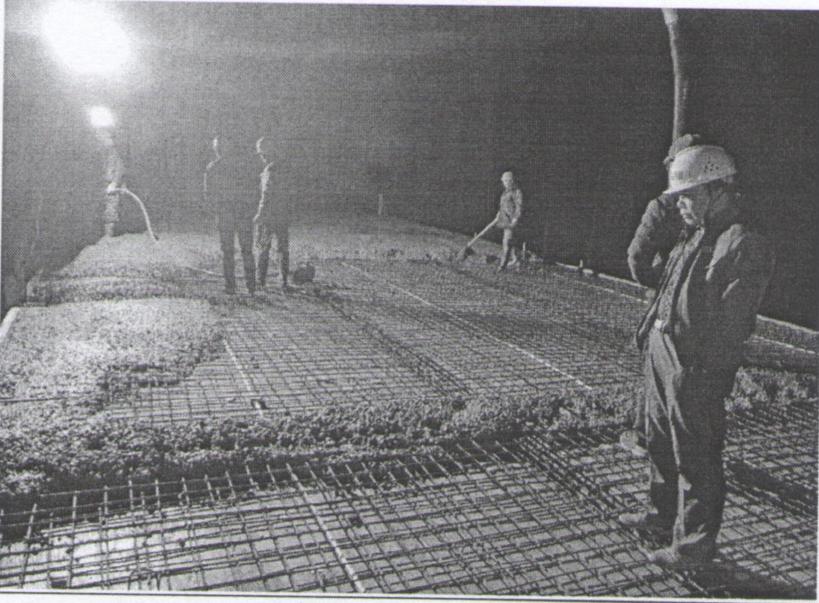


旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇4*20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：ZHJL-PZ-013

日期及气候：2017年11月18日 阴	工程地点：庙前镇4*20MWp光伏发电项目配电楼
旁站监理的部位及工序： 配电楼基础浇筑 商砼—C40	
旁站监理开始时间： 18:10	旁站监理结束时间： 19:30
<p>施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。</p> <p>监理情况：监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸，均符合要求。检查产品合格证及检验证明，现场制作标准养护试件试块，作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。当混凝土分层浇筑时，投料适中，振捣上一层混凝土时，插入下一层中50mm左右，以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为25-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。</p>	
	
发生情况： <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">无</div>	
处理意见： <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">无</div>	
施工企业： 湖南卓越建设有限公司 项目经理部：庙前镇4*20MWp光伏发电项目 质检员（签字）： <div style="text-align: center;">  </div>	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：庙前镇4*20MWp光伏发电项目 旁站监理人员（签字）： <div style="text-align: center;">  </div>
