
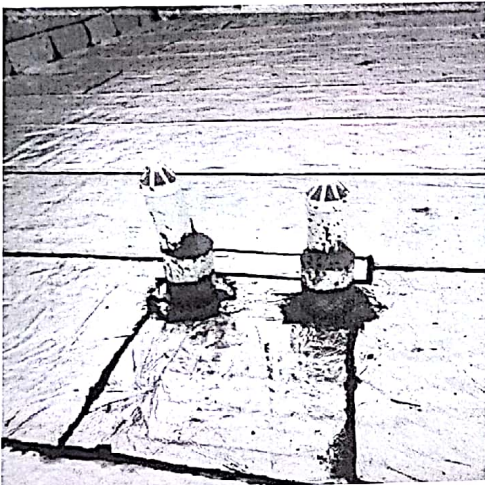


旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-028

日期及天气: 2018.04.01	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼顶楼防水细石混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 早 8.30	旁站监理结束时间: 中午 11.40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、今现场旁站查验, 防水卷材横向搭接 80mm, 竖向搭接 100mm, 没有气泡和起鼓现象。 2、阴角及出风口和地漏落水管出口等处卷材按要求施工, 无粘接不牢等情况; 卷材与墙面附着紧密。 3、卷材的坡向按图纸要求施工。 4、细石混凝土浇筑前, 顶楼全部清扫干净, 操作程序符合细石混凝土的施工要求。	
 	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 刘成文 2018 年 04 月 01 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

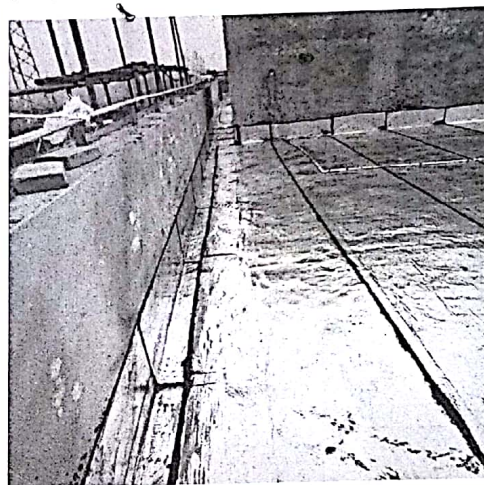

由 扫描全能王 扫描创建
