


旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-046

日期及天气: 2018.10.10 晴	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 38#箱逆变基础平台浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 11: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、 监理人员检查模具几何尺寸为长 10118mm, 宽 3255mm, 平台厚度为 150mm。 2、 主梁钢筋规格为 $\Phi 16$、$\Phi 18$、分布筋规格为 $\Phi 8$, 间隙为 200 mm, 钢筋绑扎符合规范要求。 3、 混凝土标号为 (C30), 现场制作标准养护试块, 作为验证配合比依据, 浇筑时投料适中, 振动器振捣时插点均匀, 震动时间满足要求; 没有漏浆、跑浆现象发生。 4、 要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜, 进行保湿养护。	
	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 刘成文	2018 年 10 月 10 日

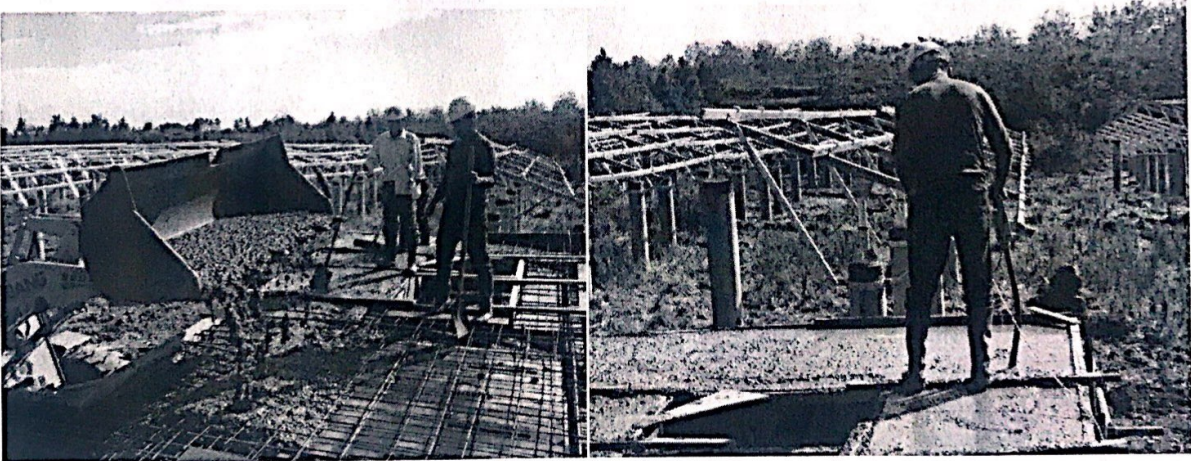
