

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-048

日期及天气：2018.10.27 多云

施工单位：湖南卓越建设有限公司


旁站监理的部位或工序：光伏区 39#箱逆变基础平台浇筑旁站

旁站监理开始时间： 10: 15

旁站监理结束时间： 11: 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、 监理人员检查模具几何尺寸为长 10118mm，宽 3255mm，平台厚度为 150mm。
- 2、 主梁钢筋规格为 $\Phi 16$ 、 $\Phi 18$ 、分布筋规格为 $\Phi 8$ ，间隙为 200 mm,钢筋绑扎符合规范要求。
- 3、 混凝土标号为 (C30)，现场制作标准养护试块，作为验证配合比依据，浇筑时投料适中，振动器振捣时插点均匀，震动时间满足要求；没有漏浆、跑浆现象发生。
- 4、 要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。

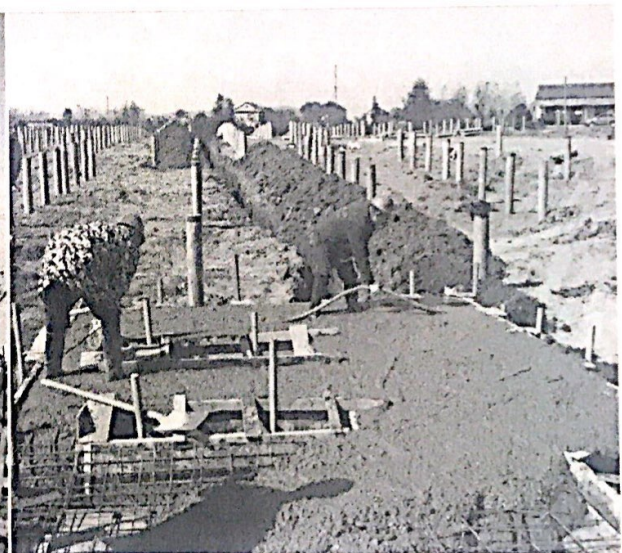

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：

徐恩恩

2018 年 10 月 27 日



由 扫描全能王 扫描创建
