

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-050

日期及天气: 2018.11.02 多云

施工单位: 湖南卓越建设有限公司


旁站监理的部位或工序: 光伏区 35#箱逆变基础平台浇筑旁站

旁站监理开始时间: 9: 30

旁站监理结束时间: 11: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、 监理人员检查模具几何尺寸为长 10118mm, 宽 3255mm, 平台厚度为 150mm。
- 2、 主梁钢筋规格为 $\Phi 16$ 、 $\Phi 18$ 、分布筋规格为 $\Phi 8$, 间隙为 200 mm, 钢筋绑扎符合规范要求。
- 3、 混凝土标号为 (C30), 现场制作标准养护试块, 作为验证配合比依据, 浇筑时投料适中, 振动器振捣时插点均匀, 震动时间满足要求; 没有漏浆、跑浆现象发生。
- 4、 要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜, 进行保湿养护。

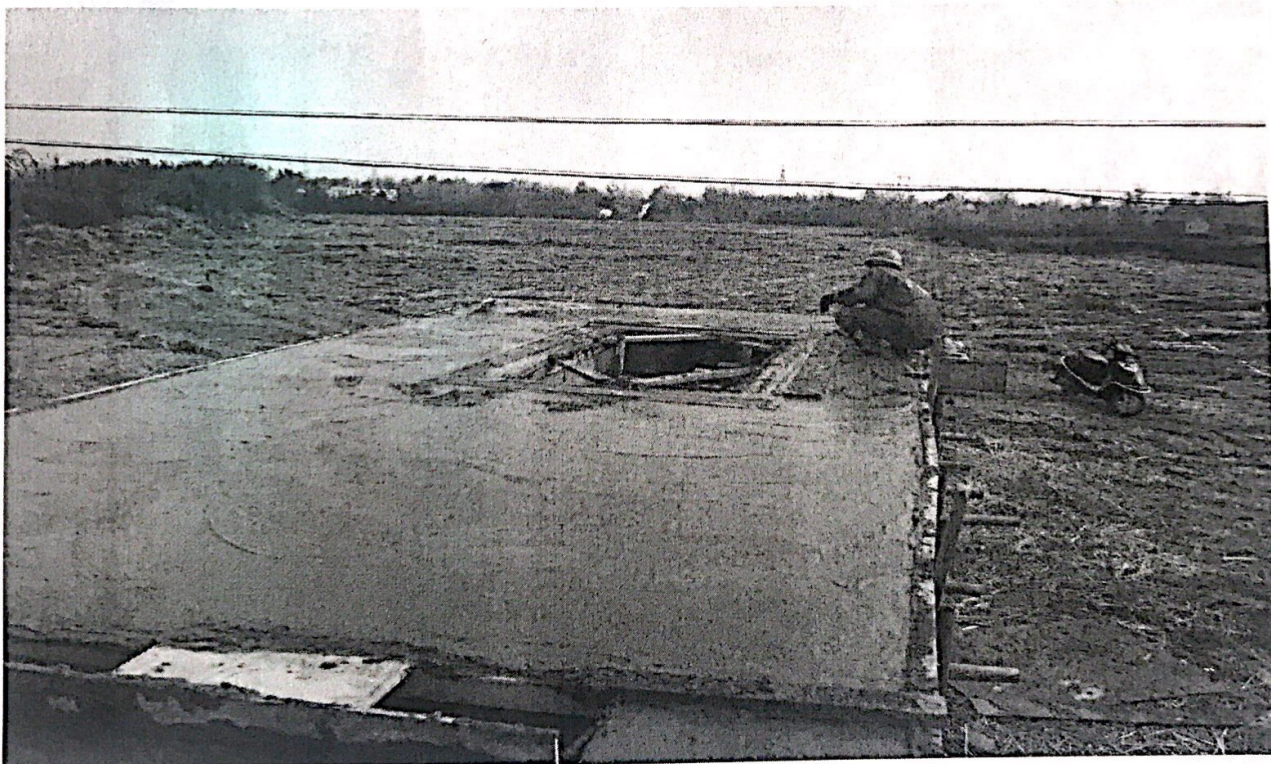

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

(Handwritten signature)

2018 年 11 月 02 日



由 扫描全能王 扫描创建
