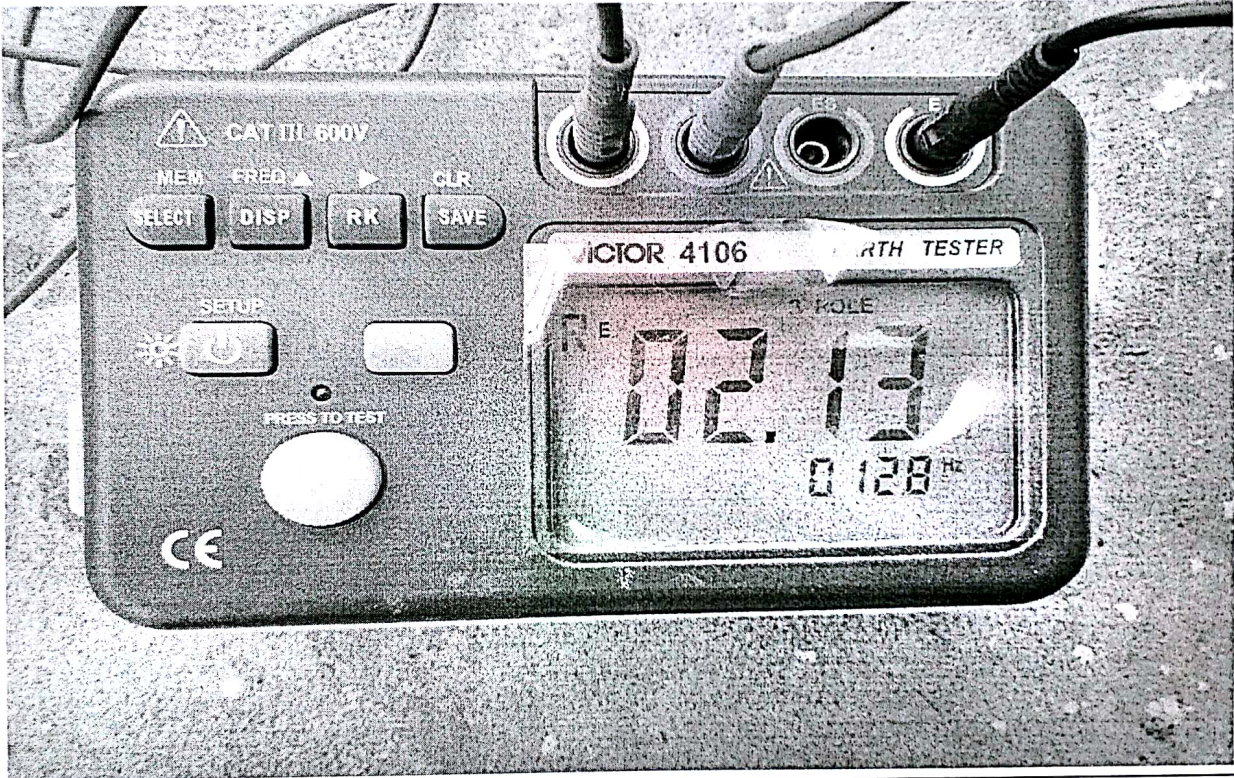


旁站监理记录表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：SQXH-JLPZ-005

日期及天气：2017.12.15/ 晴	施工单位：上海上电电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：H5-H6 测量接地电阻	
旁站监理开始时间：2017.12.15 9: 20	旁站监理结束时间：2017.12.15 10: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工 4 人，一台接地电阻测试仪、一把 30 米卷尺。 2、关键工序施工：测量接地极之间的距离--打入辅助接地棒--配线--使用接地电阻测试仪测试电阻--J 记录读数	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： <u>王洪伟</u> 2017 年 12 月 15 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
