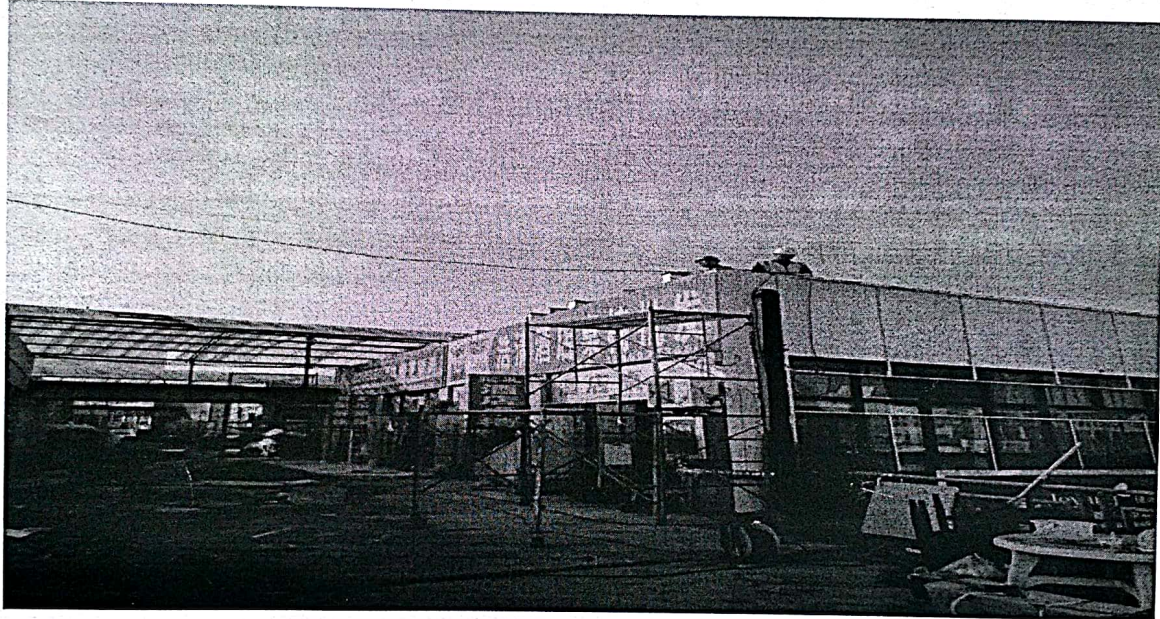


旁站监理记录表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：SQXH-JLPZ-001

日期及天气：2017.11.20 多云	施工单位：上海上电电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主梁支墩安装	
旁站监理开始时间：2017.11.20 8:00	旁站监理结束时间：2017.11.20 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工6人，一台红外水平仪、标尺、记号笔、白线，一台电锤、扳手。 2、关键工序施工：拉白线——测量定位支墩位置——电锤打膨胀螺丝眼——红外水平仪找水平确定支墩高度——固定支墩拧紧膨胀螺丝。	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：王洪伟 2017年11月20日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
