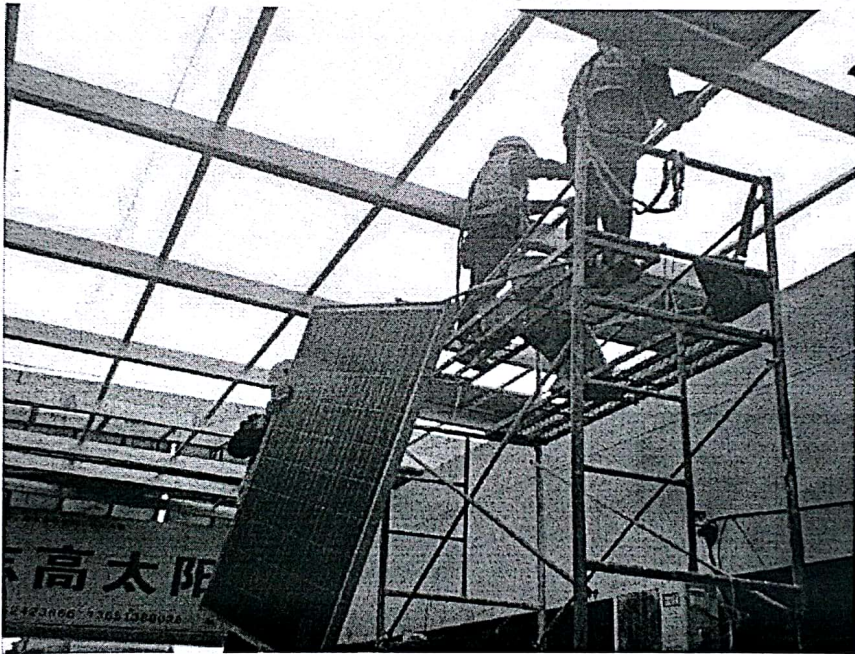


## 旁站监理记录表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编 号：SQXH-JLPZ-002

|                                                                                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及天气：2017.11.25 晴                                                                                                                                                                    | 施工单位：上海上电电力工程有限公司         |
| 旁站监理的部位或工序：安装组件                                                                                                                                                                       |                           |
| 旁站监理开始时间：2017.11.25 8:10                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：2017.11.25 11:20 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、现场施工 4 人，一台组合式脚手架，内六角扳手、普通扳手、螺丝刀，接地跨接线。</p> <p>2、关键工序施工：检查活动脚手架、佩戴安全带、做好安全防护措施——工人到脚手架上后系好安全带挂钩——组件分两道递接到安装部位定位——紧固压块紧固膨胀螺丝——组件间连接 MC4 接头——安装接地跨接线。</p> |                           |
|                                                                                                    |                           |
| 发现的问题及处理情况：无                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>旁站监理人员（签字）：王洪伟</p> <p style="text-align: right;">2017 年 11 月 25 日</p>                                                                                                              |                           |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
