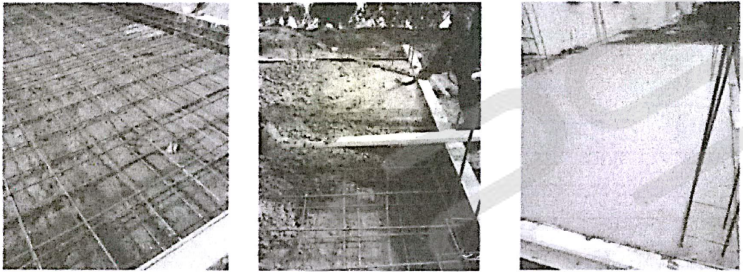


旁站监理记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程 编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018.1.1 晴	工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 砼浇筑前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。  监理情况： 监理人员检查钢筋绑扎及模板的尺寸，均符合要求。检查商砼出厂证明、合格证，要求现场制作试块，标准养护试件作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振捣器插点均匀。连续震动时间约为25s-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）：葛庆强、任维维、张良飞 2018年 / 月 / 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。
