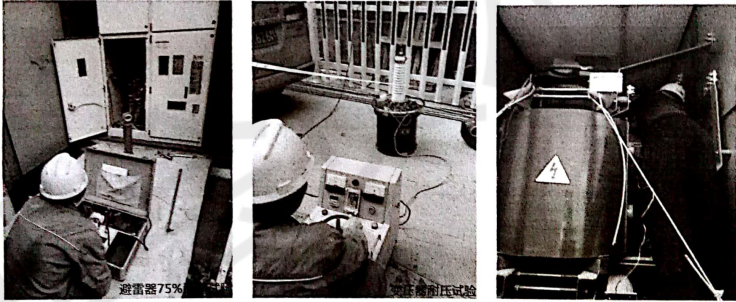


旁站监理记录表

工程名称: 山东和乐门业光伏发电工程项目 编号: ZHJL-SDHILMY-

日期及气候: 2018年6月16日 晴	工程地点: 德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位及工序: 1、2#箱式变压器常规试验	
旁站监理开始时间: 12: 00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 4 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 试验人员 2 人, 记录人员 1 人。 4. 施工器具: 便携式直流高压测试仪、变压器直流电阻测试仪、充气式试验变压器、ZBY-Z 变比组别测试仪、开关接触电阻测试仪。 5. 试验内容: 直流电阻测试、变比试验、变压器耐压试验、绝缘试验、避雷器 75% 泄露试验。	
	
监理情况: 1. 安全员已到位。 2. 现场安全警示措施到位。 3. 试验操作过程符合要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 化善善 2018 年 06 月 16 日	
