

旁站监理记录表

工程名称: 山东和乐门业光伏发电工程项目 编号: ZHJL-SDHLMY-


日期及气候: 2018年6月17日 多云 工程地点: 德州市齐河县和乐门业有限公司

旁站监理的部位及工序: 4、5#箱式变压器电缆头耐压试验

旁站监理开始时间: 13: 00 旁站监理结束时间: 14:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。
2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。
3. 作业人员共计 4 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 试验人员 2 人, 记录人员 1 人。
4. 施工器具: 发电机、摇表、ZGF 系列直流高压发生器、电抗器、放电棒等。

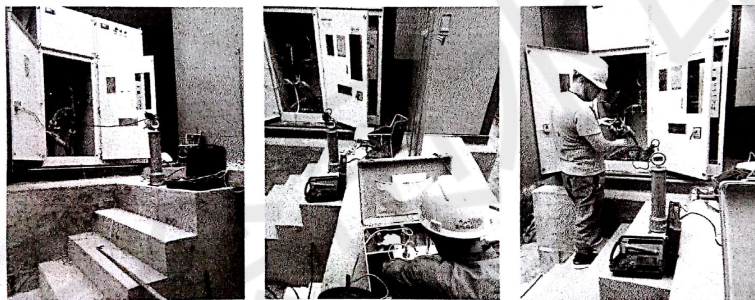

监理情况:

1. 测试前已进行安全交底。
2. 安全员已到位。
3. 现场安全警示措施到位。
4. 试验操作过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 何善善

2018 年 06 月 17 日
