


旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-017

日期及天气：2018、4、8 多云 14~26℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 1 号铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：下午 13 点 10 分	旁站监理结束时间：下午 17 点 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 铁塔基础浇筑采用 C25 商砼，商砼运输时间 1 小时 10 分，采用吊车加溜槽投送，插入式振动棒进行振捣，浇筑混凝土共 62m³，现场采用分层浇筑，浇筑前对基础配筋进行检查，对支模的尺寸及牢固性进行检查，对预埋螺栓的尺寸进行复核，对商砼的送料单进行确认，混凝土标号符合设计要求，整个浇筑过程符合规范要求。	
 1号铁塔基础浇筑	
发现的问题及处理情况： 浇筑时振捣不均匀，现场督促要及时振捣，均匀振捣，基本保证了浇筑质量。	
旁站监理人员（签字）： <u>常庆斌</u>	

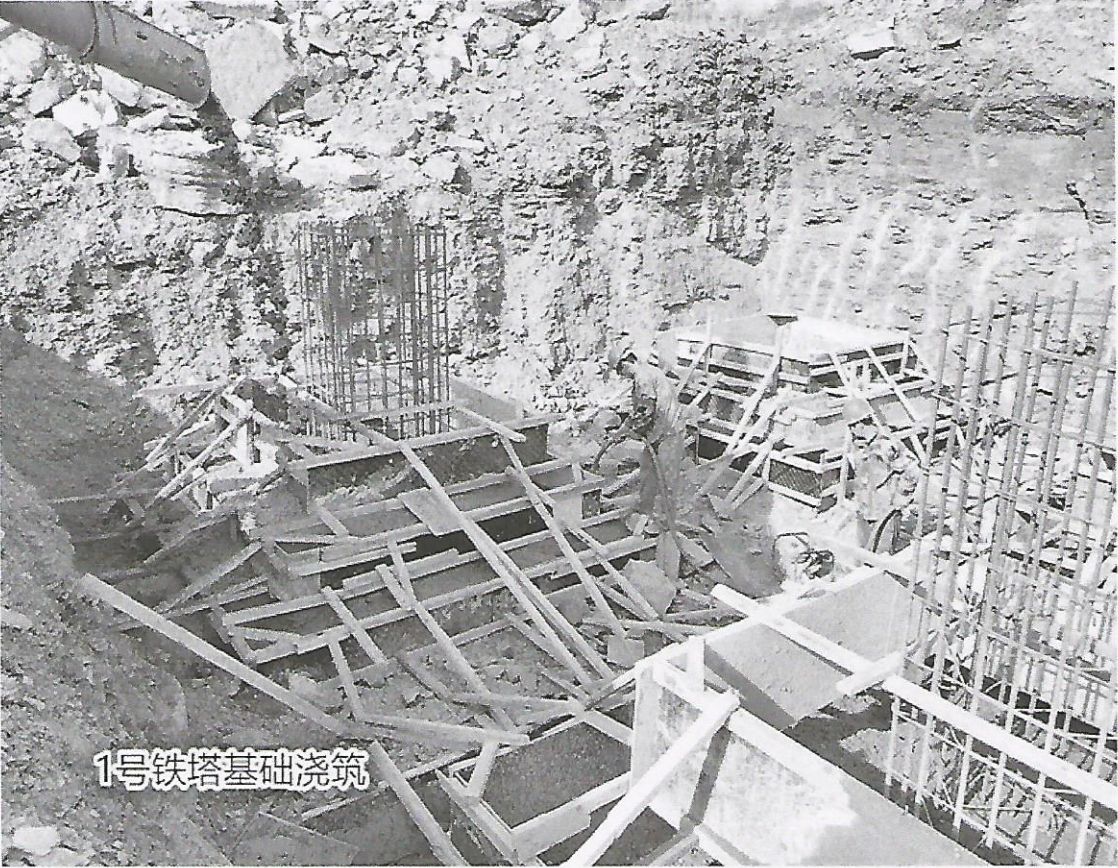
