


## 旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程) 编号: JZL6-019

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 日期及天气: 2018、4、24                                                                                                                                                                                                                                                             | 多云 8~20℃ | 施工单位: 中机国能电力工程有限公司     |
| 旁站监理的部位或工序: 综合楼二层梁、板、柱浇筑                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
| 旁站监理开始时间: 上午 10 点 10 分                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 旁站监理结束时间: 下午 15 点 40 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>综合楼二层梁、板、柱浇筑, 选用恒瑞混凝土有限公司提供的 C30 商砼, 采用泵车投送, 两台插入式振动棒及时振捣, 3 台水泥罐车不间断运送, 运输时间 1:20 分, 一次性浇筑完成, 无施工缝, 浇筑总方量 56m<sup>3</sup>, 现场施工人员 12 人, 安排专人对模板进行不间断监控。浇筑前对满堂架的搭设进行检查, 对梁、板、柱配筋进行检查, 对支模的尺寸及牢固性进行检查, 对商砼的送料单进行确认, 对商砼塌落度进行检测, 对混凝土试块制作进行监督。</p> |          |                        |
| <p>综合楼二层梁、板、柱浇筑<br/>2018、4、24</p>                                                                                                                                                         |          |                        |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p style="padding-left: 40px;">整个浇筑过程正常, 没有异常情况。</p>                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
| <p>旁站监理人员 (签字): 常庆斌</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |

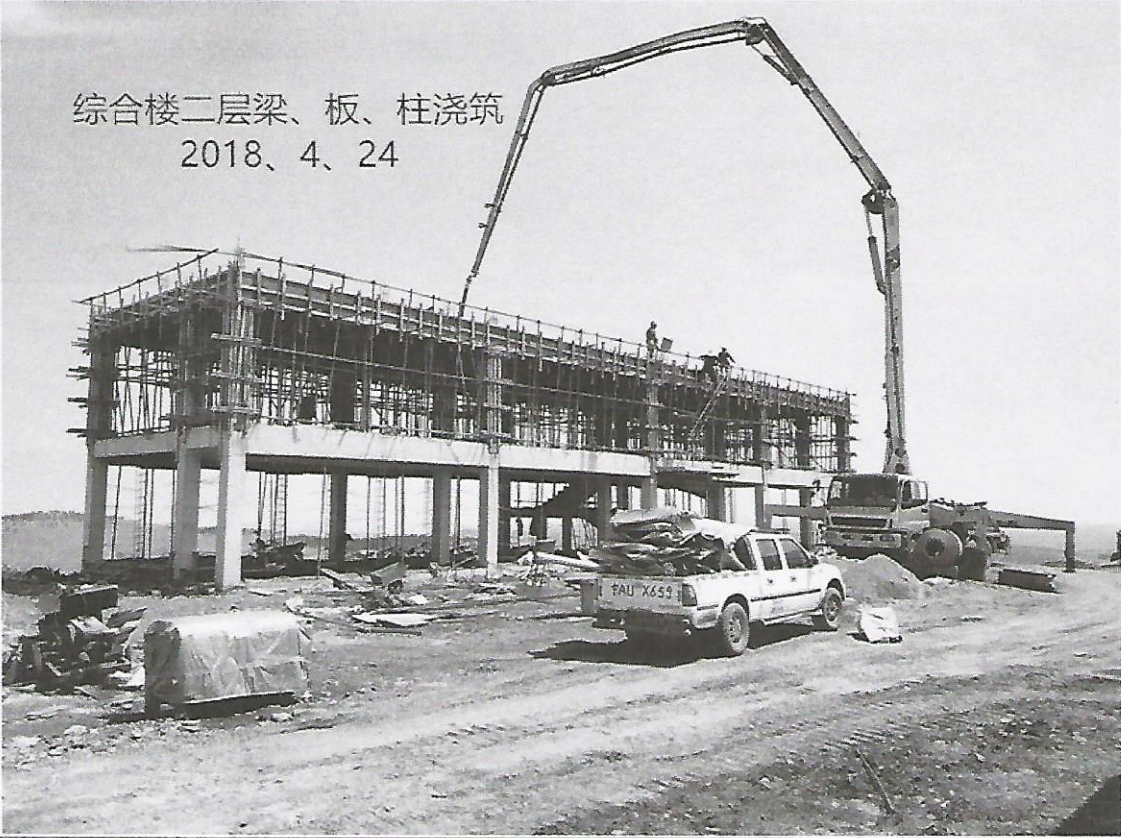
